

工程进度汇报

项目名称	宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2023 年 06 月 09 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	75 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	100% 1.5%		
本周下雨天数	2.5 天	实际可施工天数	4.5 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、项目部已落实，具备开会和办公条件；项目部五牌一图已制作完成，已落实具体位置安装展示。 2、施工人员已进场进行施工，屋顶新安装檩条定位放线基本完成，檩条焊接进行中，固定基本完成；满焊完成约 40%。 3、施工单位和监理单位的开工报审资料已递交至建设单位。 4、光伏直流线缆到货，价值约 3 万元。 5、其他材料和设备品牌落实采购中。		
投资情况	本周光伏直流线缆到货一批进场，价值约 3 万元；施工劳务约 1.0 万元；累计完成产值约 8 万元，约占总合同价的约 2.28%(按合同价 352.81 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、增加施工人员进场人数，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。 2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，基本完成。 3、光伏组件和桥架进场并进行安装，完成进度约 30%;并网柜基础基坑进行定位放线完成 100%。 4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。		
周工作小结	继续做好防消防和其他安全的教育宣贯，加强消防和其他安		

	全防范措施；项目部建立并进行布置。屋顶安装等开始施工。
需要协调问题	无

目前进度：

- 1、项目部已落实，具备开会和办公条件；项目部五牌一图已制作完成，已落实具体位置安装展示。
- 2、施工人员已进场进行施工，屋顶新安装檩条定位放线基本完成，檩条焊接进行中，固定基本完成,满焊完成约 40%。
- 3、施工单位和监理单位的开工报审资料已递交至建设单位。
- 4、光伏直流线缆到货，价值约 3 万元。
- 5、其他材料和设备品牌落实采购中。

投资情况：

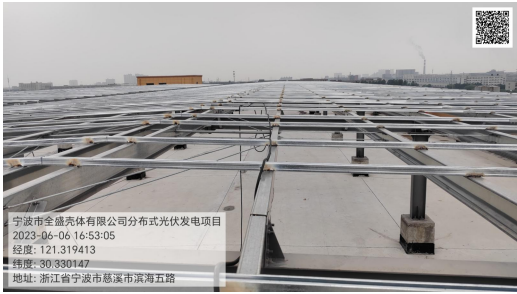
本周光伏直流线缆到货一批进场，价值约 3 万元；施工劳务约 1.0 万元；累计完成产值约 8 万元，约占总合同价的约 2.28%(按合同价 352.81 万元计算)。

下步计划：

- 1、增加施工人员进场人数，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。
- 2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，基本完成。
- 3、光伏组件和桥架进场并进行安装，完成进度约 30%;并网柜基础基坑进行定位放线完成 100%。
- 4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。

附现场照片：

文字描述	光伏直流线缆到货	檩条进行焊接固定
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-09 11:09:10 经度: 121.320499 纬度: 30.329315 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-09 10:10:46 经度: 121.319621 纬度: 30.33049 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路

文字描述	初具形象	焊缝清理
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-06 16:53:05 经度: 121.319413 纬度: 30.330147 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-06 16:45:48 经度: 121.319516 纬度: 30.330485 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
文字描述	材料拼接	焊接后情况
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-05 15:23:38 经度: 121.319778 纬度: 30.330265 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-06 16:45:20 经度: 121.319572 纬度: 30.33049 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
