

工程进度汇报

项目名称	宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2023 年 06 月 30 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	75 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	100% 60%		
本周下雨天数	1 天	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、光伏组件安装，基本完成，光伏线缆敷设完成约 90%。 2、组串连接和逆变器接头制作完成约 30%。 3、逆变器安装全部完成，屋顶桥架安装基本完成。 4、并网柜基础制作施工完成。 5、本周没有新材料和设备进场。其他材料和设备品牌落实采购中。		
投资情况	本周没有新材料和设备进场；施工劳务约 2.0 万元；累计完成产值约 217.5 万元，约占总合同价的约 62.0%(按合同价 352.81 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、光伏组件和桥架继续安装，组件安装全部完成，屋顶桥架安装完成，下引桥架全部完成。 2、光伏直流线缆敷设全部完成，组串和接头制作全部完成。 3、并网柜和交流线缆到货，进行安装设备和敷设线缆。 4、并网资料整理并进行提交供电公司。 5、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。		
周工作小结	继续做好消防和其他安全的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施，把安全生产月活动贯穿始终。		
需要协调问题	无		

目前进度：

- 1、光伏组件安装，基本完成，光伏线缆敷设完成约 90%。
- 2、组串连接和逆变器接头制作完成约 30%。
- 3、逆变器安装全部完成，屋顶桥架安装基本完成。
- 4、并网柜基础制作施工完成。
- 5、本周没有新材料和设备进场。其他材料和设备品牌落实采购中。

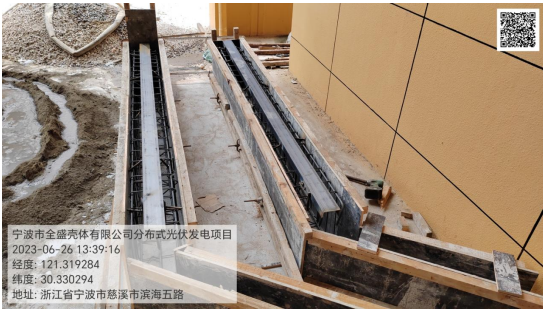
投资情况：

本周没有新材料和设备进场；施工劳务约 2.0 万元；累计完成产值约 217.5 万元，约占总合同价的约 62.0%(按合同价 352.81 万元计算)。

下一步计划：

- 1、光伏组件和桥架继续安装，组件安装全部完成，屋顶桥架安装完成，下引桥架全部完成。
- 2、光伏直流线缆敷设全部完成，组串和接头制作全部完成。
- 3、并网柜和交流线缆到货，进行安装设备和敷设线缆。
- 4、并网资料整理并进行提交供电公司。
- 5、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。

附现场照片：

文字描述	光伏组件安装-1	光伏线缆桥架开穿线孔
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-25 16:59:38 经度: 121.319296 纬度: 30.329821 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-26 08:50:39 经度: 121.319816 纬度: 30.330319 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
文字描述	并网柜基础钢筋绑扎和支模完成	并网柜基础混凝土浇筑振捣
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-26 13:39:16 经度: 121.319284 纬度: 30.330294 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-26 15:20:01 经度: 121.319284 纬度: 30.330313 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路

文字描述	逆变器终端制作及连通测试	组件组串连接
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-30 10:11:07 经度: 121.319853 纬度: 30.330292 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-30 10:04:15 经度: 121.319571 纬度: 30.329739 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
文字描述	桥架开孔中	组件安装基本完成
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-30 10:11:19 经度: 121.319848 纬度: 30.330293 地址: null	
