

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2025 年 1 月 3 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程				填报周期: 2024 年 12 月 28 日-2025 年 1 月 3 日		
项目分月投产计划 (万千瓦)						
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
一、本周现场人员情况						
管理方	单位名称	人员分类		人数		
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员		2		
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	获取工作面开发人员				
		工程管理人员		9		
		现场施工工人		70		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员		4		
二、本周施工情况						
襄大: 1~16 号棚加固全部完成, 打桩完成 84%, 导轨完成 90%, 组件完成 50%、围栏完成 20%、桁架焊接完成 23 副, 系杆完成 20 副						
新兴种猪:						
龙兴养殖:						
东于水屯营村工商业: 通讯箱安装完成						
中唐市场工商业:						

三、物资到货情况

户用：

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0) 万米，累计到货(23.0112) 万米。
5. 本周交流电缆到货(0) 万米，累计到货(0) 万米。

襄大：

1. 本周管桩到货(0) 根，累计到货(4008)根，达到总量的(91)%。
2. 本周导轨到货(18672)米，累计到货(38676)米，达到总量的(100)%
3. 本周支架到货(0)吨，累计到货(69.89)吨，达到总量的(4)%
4. 本周组件到货(2.87) MW，累计到货(12.245)MW，达到总量的(28.5)%。

新兴种猪：

1. 本周管桩到货(0) 根，累计到货(835)根，达到总量的(100)%。

龙兴养殖

1. 本周管桩到货(0) 根，累计到货(504)根，达到总量的(100)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0) 万米。
5. 下周交流电缆计划到货(0) 万米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0) 万米。

四、备案情况（如有）

户用：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。其中，

已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp, 累计已完成(55) MWp 备案。
其中，已完成安装后补备案(0)MWp, 新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp, 累计已安装完成(2.74)MWp, 完成总量的（1.61）%。

下周计划安装（0 ）MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（1）块，其中安装（1）块，累计安装（66）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp, 项目共并网(7.7)MWp, 完成总量的（4.5）%。

七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 70 人。

襄大：组件、围栏安装、焊接桁架

新兴种猪：

东于水屯营村工商业：

中唐市场：

八、施工情况说明

户用累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）


填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2025年1月3日

附件：工程现场照片

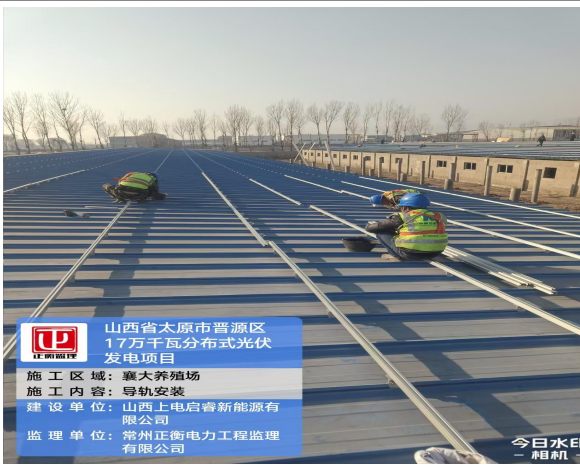



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目

施工区域：晋源区
施工内容：光伏支架
计划工期：2025.01.01-2025.01.01
地点：晋源区
监理单位：山西上地能源科技有限公司
施工单位：通号工程局集团有限公司

今日水印相机
你的名字



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目

施工区域：晋源区
施工内容：光伏支架
计划工期：2025.01.01-2025.01.01
地点：晋源区
监理单位：山西上地能源科技有限公司
施工单位：通号工程局集团有限公司

今日水印相机
你的名字

