

新沂户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 3 周

项目名称:安徽新沂 350MW(一期 250MW)户用分布式光伏发电项目	填报周期: 2023 年 7 月 15 日 - 7 月 21 日
--------------------------------------	----------------------------------



项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	3
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	3	4	4	4	4	3

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	新沂上电申宏新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	100
		工程管理人员	2
		现场施工工人	36
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	1

二、本周获客情况

本月计划获客 (1200) 户。本周实际获客 (69) 户, 其中, 平屋面 (69) 户, 斜屋面 (0) 户, 预计可安装容量 (1.58) MW。项目累计获客 (244) 户, 其中 (39) 户已开始或完成建设, (127) 户尚未开始建设, 反悔等不具备建设条件的户数 (78) 户。

下周计划获客 (75) 户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0 吨, 累计到货(95.2621)吨

2.本周组件到货(0.85536)MW, 累计到货(2.44728)MW, 达到总量的 (0.98)%。

3.本周逆变器到货(10)台, 累计到货(128)台, 达到总量的 (11.26) %。

是否存在到货不足影响连续施工的风险? 是/否

否

四、勘探情况

本周共计勘测 47 户, 勘测块数 1290 块, 勘测容量 696.6KW, 其中客户反悔有 10 户

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装 (0.5) MWp。本周实际安装完成(0.44334)MWp, 累计已安装完成(0.49842)MWp, 完成总量的 (0.022) %。

下周计划安装 (0.8) MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交 (70) 户并网审核资料。本周计划向电网递交 (44) 户并网审核资料, 实际递交 (44) 户并网审核资料。累计递交 (50) 户, 下周计划向电网递交 (9) 户并网审核资料。

本周电表获取/安装 (0) 块, 下周需求 (0) 块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量? 是/否

是

本周并网(0)MWp, 本月累计并网(0)MWp, 项目共并网(0)MWp,完成总量的 (0) %。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1、竞争激烈我公司业务费比同行低，业务员频繁跳槽


总包公司领导和政府相关部门协商解决应对当前出现的问题！

2、城管执法局阻挠安装，影响安装进度影响业务员积极性
开发部再增加业务员！

填报人张望；审核人：张俊；时间：2023年7月21日

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）

组件安装	逆变器安装
	
组串接线	电表箱安装接线

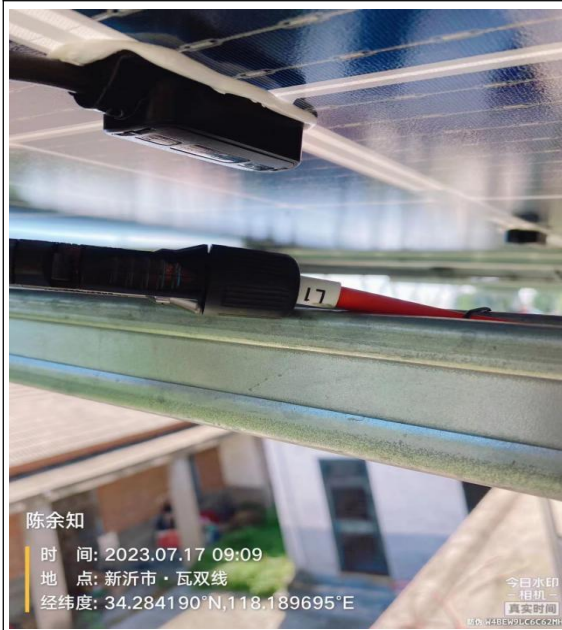

接地电阻测试



监理现场检查



支架安装



施工站班会

 工程记录 拍摄时间: 2023.07.20 19:26 天气: 多云 28°C 地点: 徐州市·迎宾路	 06:56:28 2023-07-07 星期五 江苏省徐州市新沂市合沟镇 董董百货超市 马克水印相机 马克相机已验证照片真实性
接地焊接	组件回路电压测试
 陆荣裕 时间: 2023.07.18 11:58 地点: 新沂市·马棋线 经纬度: 34.207611°N, 118.230412°E	 贺夫美 时间: 2023.07.15 10:20 地点: 新沂市·福桥路 经纬度: 34.344186°N, 118.123582°E
逆变器安装	防水处理

