



正衡监理 常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 周 报

工程名称： 京能科技明月海洋二期1.65MW分布式光伏发电项目

2023 年 12 月 第 8 期

（2023 年11月28日 至 2023年12月04日）

项目监理部（章）：

总监理工程师： 修智明

报告日期： 2023 年12月04日



监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期56天；安全生产56天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
8. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		4人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	夹具安装	2023. 10. 10	2023. 10. 20	已完成100%
2	导轨安装	2023. 10. 13	2023. 10. 20	已完成100%
3	走道板安装	2023. 10. 20	2023. 11. 06	已完成100%
4	逆变器及支架安装	2023. 10. 21	2023. 11. 05	已完成100%
5	桥架安装	2023. 10. 22	2023. 11. 07	已完成100%
6	组件安装	2023. 10. 25	2023. 11. 20	已完成100%
7	接地扁铁安装	2023. 10. 31	2023. 11. 10	已完成100%
8	直流电缆敷设	2023. 11. 05	2023. 11. 08	已完成100%
9	交流桥架	2023. 11. 23		已完成40%
10				



三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	配电室电缆顶管，交流桥架安装，直流桥架盖板安装，走道板C型卡扣安装。消缺整改。	交流桥架安装，交流电缆敷设，电缆头制作安装。消缺整改。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	彩钢瓦屋面扣件及连接件安装工艺达标；逆变器安装位置符合要求；桥架安装按图施工；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	夹具、导轨、桥架、接地扁铁、逆变器、直流电缆、组件、交流电缆、并网柜全部到货。	无

四、施工质量问题情况：

- 1、交流桥架支架未做防腐，已整改。
- 2、检测开路电压发现个别组串未有电压，已整改

五、施工安全问题情况

- 1、交流支架焊接过程中未配备灭火器。
- 2、配电房内交流桥架安装时未有人看护。

六、监理工作情况

- 1、日常巡视检查。
- 2、每周监理检查记录




- 3、检查交流桥架制作安装情况
- 4、检查交流电缆型号规格。
- 5、检查顶管情况
- 6、检查组串开路电压

七、其他事宜:

- 1、无。

八、工程形象进度照片

交流桥架安装	交流电缆顶管
	
交流电缆进场卸货	交流电缆顶管开挖
	
直流桥架盖板	检查组串开路电压

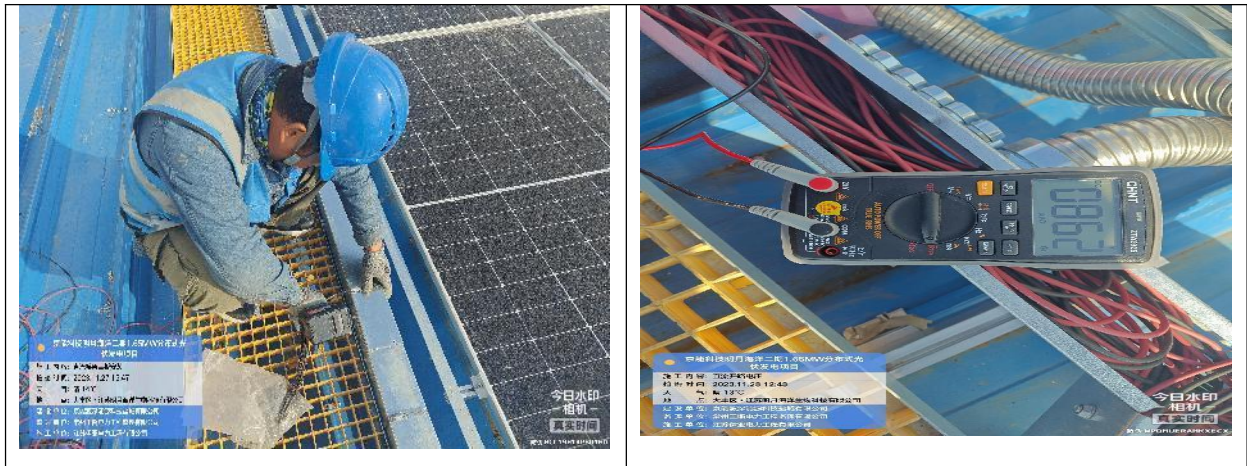

常州正衡电力工程监理有限公司
京能科技明月海洋二期1.65MW分布式光伏发电项目
监理项目部
2023年12月04日
