

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

建设单位：滁州道永新能源有限公司

填报周期：2023-12.-01-2023-12-08 日

一、项目总体建设进度汇总：

1. 五金车间和公用工程用房屋面组件安装完成 100%。
2. 电缆顶管完成 100%。
3. 五金车间及公用工程用房屋面组件连线完成 100%。
4. 五金车间及公用工程用房屋面直流电缆敷设完成 40%。
5. 成品库屋面组件安装完成 20%。
6. 罐装车间屋面支架夹具安装完成 30%。

7. 主要设备、材料到场情况：

名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%
逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%
交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%
铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%
支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%
电缆桥架		1558m	已到货 100%
直流电缆		22000m	已到货 100%

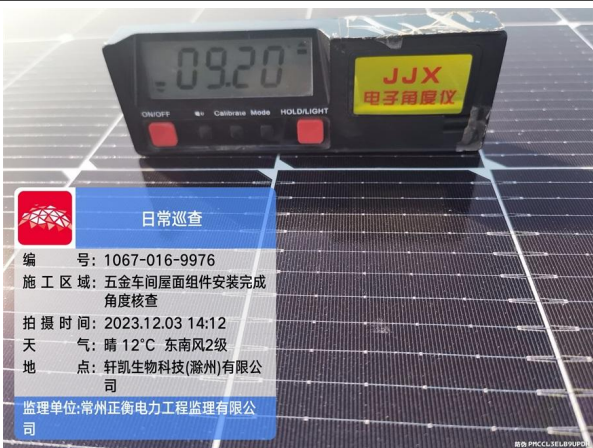
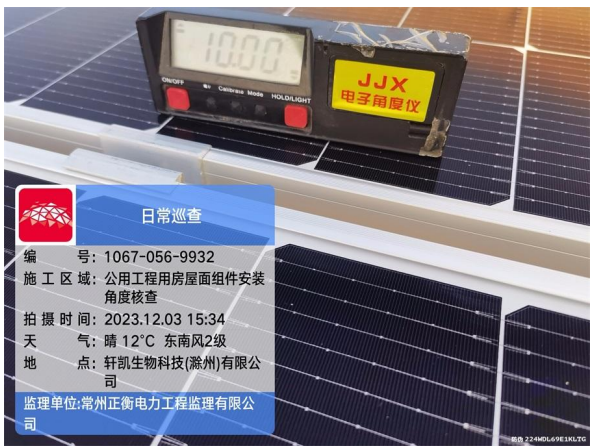
二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

1. 计划完成五金车间和公用工程用房屋面直流电缆敷设及桥架安装施工，完成 100%。
2. 计划成品库屋面组件安装，直流电缆敷设，桥架安装施工，完成 100%。
3. 计划罐装车间屋面组件，直流电缆敷设及桥架安装施工，完成 100%。
4. 计划完成粉剂包装车间组件安装，电缆敷设，桥架安装。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	公用工程用房屋面组件安装	五金车间屋面组件安装
照片	 日常巡查 编号: 1064-003-2828 施工区域: 公用工程用房屋面组件安装 拍摄时间: 2023.12.01 10:41 天气: 晴 5°C 南风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1064-084-6718 施工区域: 五金车间屋面组件安装 拍摄时间: 2023.12.02 09:34 天气: 晴 0°C 东北风1级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	五金车间屋面组件安装角度检查	公用工程用房屋面组件安装角度检查
照片	 日常巡查 编号: 1067-016-9976 施工区域: 五金车间屋面组件安装完成角度核查 拍摄时间: 2023.12.03 14:12 天气: 晴 12°C 东南风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1067-056-9932 施工区域: 公用工程用房屋面组件安装角度核查 拍摄时间: 2023.12.03 15:34 天气: 晴 12°C 东南风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	成品库屋面支架安装	成品库屋面组件安装

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

照片		
文字描述		
