

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

建设单位：滁州道永新能源有限公司	填报周期：2023-12.-16-2023-12-22 日
------------------	-------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1) 电缆顶管施工已完成施工任务。
- 2) 五金车间及公用工程用房屋面组件安装完成. 逆变器安装完成. 直流电缆敷设完成 70%；电缆桥架安完成 60%。
- 3) 成品库屋面组件安装完成 100%. 逆变器及桥架安装完成 50%. 直流电缆敷设完成 100%；电缆桥架安装完成 80%。
- 4) 罐装车间屋面组件安装完成 100%，逆变器安装完成 100%。直流电缆敷设完成 100%；电缆桥架安装完成 50%。
- 5) 材料库屋面组件安装完成 100%；直流电缆敷设 100%；逆变器安装完成 100%；电缆桥架安装完成 50%。
- 6) 发酵车间屋面组件安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%；逆变器安装完成 100%；电缆桥架安装完成 40%。
- 7) 造粒车间及粉剂车间支架安装完成 100%；直流电缆敷设完成 20%；逆变器安装完成 100%。电缆桥架安装完成 70%。
- 8) 直埋电缆沟开挖完成 100%。
- 9) 交流电缆敷设完成 50%。
- 10) 配电柜安装完成 100%。
- 11) 配电柜内低压电缆头制作完成 15%。

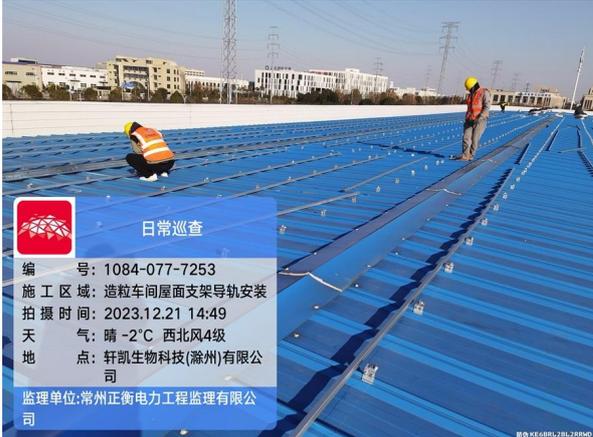
6. 主要设备、材料到场情况：

名称	厂家规格型号	本周到货	备注
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%
逆变器	深圳古瑞瓦特新能源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%
交流电缆	上海上进电缆有限公司	3883m	已到货 100%
铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%
支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%
电缆桥架		1558m	已到货 100%
直流电缆		22000m	已到货 100%

<p>二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。</p>
<p>三、下周计划主要工作内容 计划全部完成所有安装施工任务，尽早具备并网条件。</p>
<p>四. 本周现场问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因现场作业人员不足，要求增加作业人员，暂未到位。 2. 因本周降雨雪天气较多，对本在施工进度影响较大。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	造粒车间屋面逆变器安装	发酵车间屋面组件安装
照片		
文字描述	造粒车间屋面支架安装	从罐装车间到配电柜交流电缆敷设

<p>照片</p>	 <p>日常巡查</p> <p>编号: 1084-077-7253 施工区域: 造粒车间屋面支架导轨安装 拍摄时间: 2023.12.21 14:49 天气: 晴 -2°C 西北风4级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>日常巡查</p> <p>编号: 1084-016-5908 施工区域: 罐装车间到配电房电缆敷设 拍摄时间: 2023.12.21 08:28 天气: 多云 -7°C 西北风1级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司</p>
<p>文字描述</p>	<p>配电柜交流电缆头制做</p>	<p>罐装车间屋面组件吊装</p>
<p>照片</p>	 <p>日常巡查</p> <p>编号: 1086-001-6055 施工区域: 配电柜低压电缆头制作 拍摄时间: 2023.12.22 14:37 天气: 晴 0°C 东北风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司</p>	 <p>安全管理</p> <p>编号: 1084-077-7255 施工内容: 罐装车间屋面组件吊装 拍摄时间: 2023.12.22 08:09 天气: 晴 -10°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司</p>
