

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

监理周报

2023. 12. 23-2023. 12. 29



轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式用光伏发电
项目项监理部

2023 年 12 月 29 日

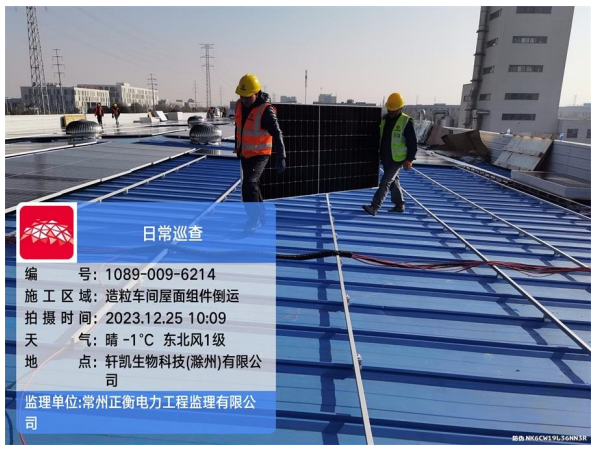
生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

建设单位：滁州道永新能源有限公司		填报周期：2023-12.-23-2023-12-29 日																																																					
一、项目总体建设进度汇总： 1. 电缆敷设施工任务已完成 95%。。 2. 组件安装施工任务已完成 98%。。 3. 配电柜安装及内部接线已完成 100%(剩余与轩凯设备搭伙接线)。 4. 逆变器安装已完成 95%。 5. 电缆桥架安装已完成 90%。 6. 主要设备. 材料到场情况： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>厂家规格型号</th> <th>本周到货</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>晶科能源 IKM580N-72H4-V</td> <td>2278×1134×35 mm.</td> <td>4008 片，已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>深圳古瑞瓦特新能 源有限公司</td> <td>125KW11 台， 50KW12 台</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>交流电缆</td> <td>上海上进电缆有限 公司</td> <td>3883m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>铝合金导轨</td> <td>清源股份有效公司</td> <td>7320m</td> <td>已带货 100%</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>6m492 根， 4m275 根</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>接地扁铁</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>40×4 2562m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>防护围栏</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>650m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>电缆桥架</td> <td></td> <td>1558m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>直流电缆</td> <td></td> <td>22000m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。 三、 下周计划主要工作内容 计划完成所有安装施工任务，完成消缺整改 80%-100%。				名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注	组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%	逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%	交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%	铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%	支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%	接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%	防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%	电缆桥架		1558m	已到货 100%	直流电缆		22000m	已到货 100%												
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注																																																				
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%																																																				
逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%																																																				
交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%																																																				
铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%																																																				
支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%																																																				
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%																																																				
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%																																																				
电缆桥架		1558m	已到货 100%																																																				
直流电缆		22000m	已到货 100%																																																				

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	罐装车间屋面组件安装	造粒车间屋面组件倒运
------	------------	------------

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

照片		
文字描述	罐装车间屋面组件安装	粉剂包装车间屋面交流电缆头端子及逆变器安装
照片		
文字描述	造粒车间到配电房电缆沟深度及宽度检查	造粒车间到配电房电缆摆放

照片

