

监理周报

日期：2023 年 12 月 08 日

签发

附件



一、本周工程简要概述

- 1、彩钢瓦屋面护栏安装。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、彩钢瓦屋面护栏安装完成 50%。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成 50%。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

严格按照施工方案执行，质量情况可控。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装方案审批。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸。

施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

主材光伏支架，辅材由施工班组自备。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理通知单 0 份，周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求


- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、厂方规章制度严格，总包严格遵守其规章制度，禁止出现违规停工现象。



十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面护栏安装检验。
- 2、施工单位资料审批。
- 3、彩钢瓦屋面采光格栅安装检查。
- 4、材料入场验收。

十一、工程照片

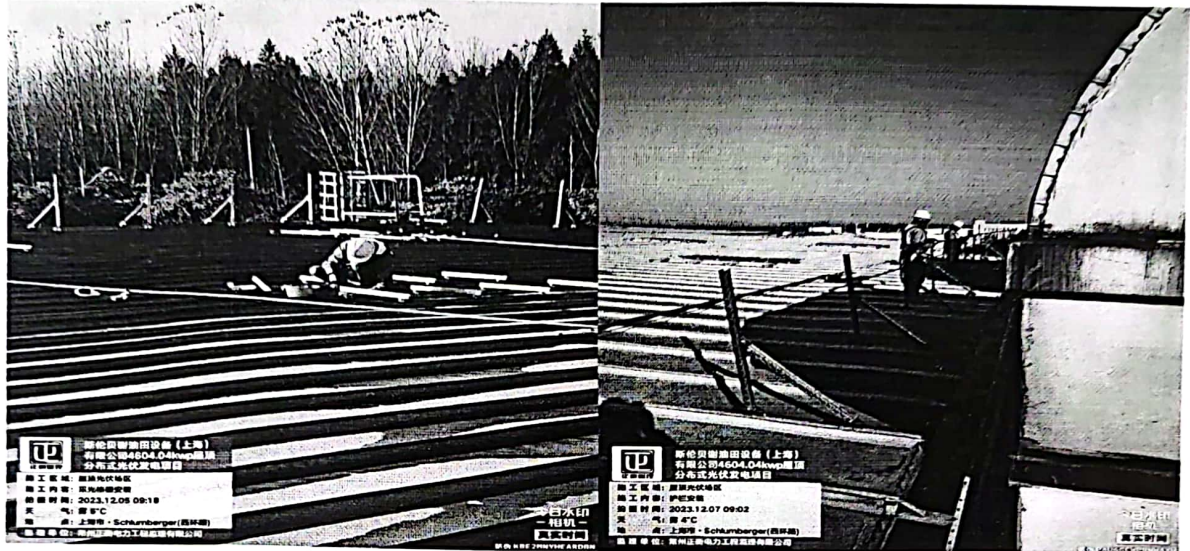

监理周报

日期：2023 年 12 月 15 日



一、本周工程简要概述

- 1、彩钢瓦屋面护栏安装。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装。
- 3、彩钢瓦屋面夹具安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、彩钢瓦屋面护栏安装完成 90%。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成 50%。
- 3、彩钢瓦屋面夹具安装完成 10%。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

严格按照施工方案执行，质量情况可控。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装限流。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸。

施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

主材光伏支架、护栏、格栅板，辅材由施工班组自备。

材料入场资料报审滞后。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、监理通知单 0 份，周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。



- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、厂方规章制度严格，总包严格遵守其规章制度，禁止出现违规停工现象。

十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面护栏、采光格栅安装检验。
- 2、施工单位资料审批。
- 3、彩钢瓦屋面光伏支架安装检查。
- 4、材料入场验收。

十一、工程照片

