



正衡监理

编号: MZCN-ZHJL-ZH-ZB-010

监 理 周 报

工程名称: 梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

2024 年 08 月 第 014 期

项目监理部 () :

总监理工程师: 商文新



报告日期: 2024 年 09 月 06 日

监理周报

2024 年 第 014 期

项目：梅州区综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目	填报周期：2024 年 8 月 31 日—9 月 06 日
一、项目总体建设汇总 1、梅州区综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目位于梅州市梅县区畚江镇梅州综合保税区，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经 115.987251、北纬度 24.003119，海拔高度约 107.5 米。占地总面积 22179M²。 2、本项目储能由 19 套 10.031MWh+1 套 9.613MWh 电池仓组成，采用 20 套 5MW 的 PCS 升压成套设备接至 35KV，容量为 100/200MWh。新建一座 110KV 变电站，110KV 配电装置采用单母线接线。采用电缆出线 1 回路，由梅州综合储能项目升压站采用单回线路接入 220KV 畚江站，形成单回综保区储能项目—畚江站 110KV 线路。设置 1 回主变进线，安装 1 台 100KVA 有载调压变压器。	
二、本周工程建设工作内容； 1、本周工地现场总包单位挖机除草及开挖排水沟施工。 2、储能设备基础开挖施工。(完成 3 只)土方开挖。 3、储能设备基础、电缆沟基础设计图纸审核完成，提出的问题设计单位更改出具纸质版蓝图。 4、储能设备基础放线施工。 5、现场临时道路修复施工。值班人员 1 人、施工人员 1 人。管理人员及技术员 2 人。	

三、本周建设总结；

- 1、本周现场基坑排水、储能场地除草、基础土方开挖施工安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。无安全事故发生。
- 2、储能项目土建、电气图纸交流会召开，各参建单位参加，并提出问题要求设计院进行审核后出具施工蓝图。
- 3、要求总包单位做好开工前的准备工作，及施工计划安排，并落实进场人员、增加机械，及材料采购计划安排，随时跟踪确保 12 月 15 日本工程并网。
- 4、监理监人员每天巡视施工现场，将发现的问题进行按照规范处理，并与业主单位及总包单位保持沟通联系。

三、 下周施工计划主要工作内容

- 1、设计院提供储能基础、消防泵房建筑图、全站总平面图、储能区以北部分防雷接地和给排水图纸纸质版本；
- 2、完成升压站设备招采流程工作；
- 3、储能区设备基础开挖 6 套，执层浇筑 6 套；
- 4、消防泵房土方开挖施工；
- 5、临时道路修复施工。

材料机械设备进场情况:

现场挖机一台

填报人: 王登营 审核人: 高立标 时间: 2024 年 09 月 06 日

监理例会



扬州综合保税区100MW/200MVA工程
EPC总承包项目

施工记录



工程名称: 扬州综合保税区100MW/200MVA工程
施工地点: 扬州市梅兰区曲江镇保税区内
时 间: 2024-09-06 星期五 17:48:39
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

临时道路施工



施工记录

时 间: 2024-09-06 星期五 17:48:39
施工地点: 扬州市梅兰区曲江镇保税区内
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

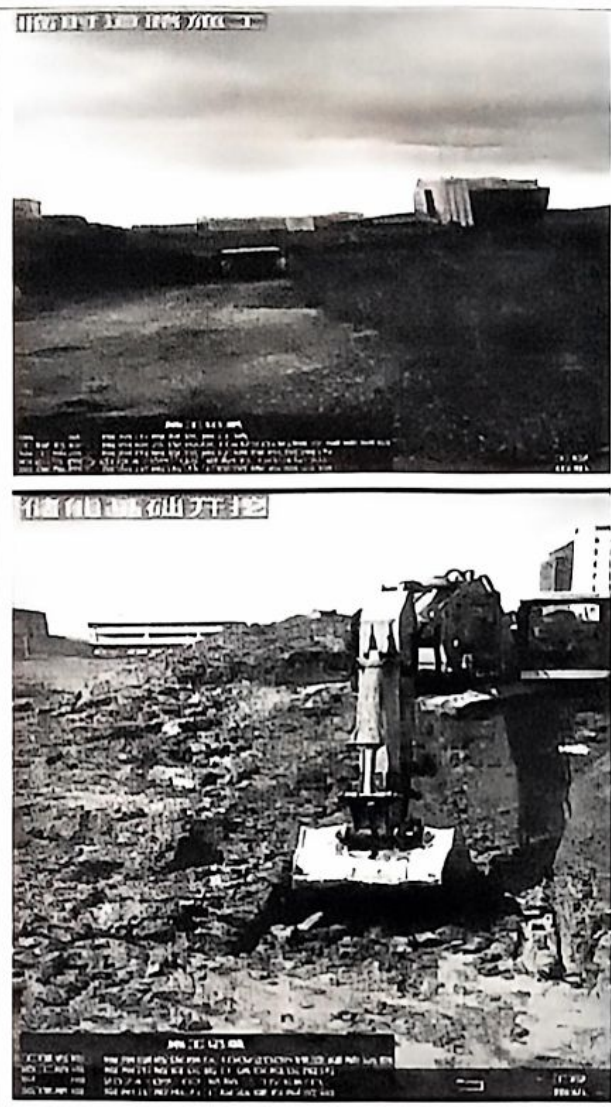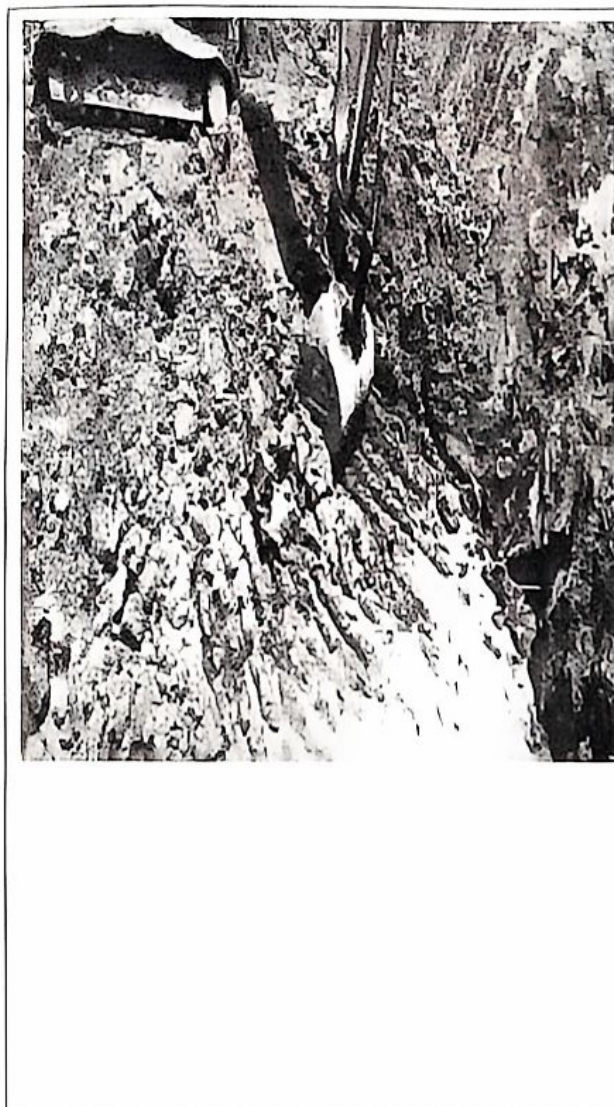

现场储能基础开挖施工

