

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-07

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 07 期）

2024 年 07 月 09 日

—

2024 年 07 月 15 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 07 月 15 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

- 1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 178 根，累计完成 1664 根。累计完成率 64.69%。
- 2) 大观园区域其它鱼塘清淤及抽水及相关协调。
- 3) 大观园区域其它鱼塘码头平整场地修建中。

2、主要材料、设备到货情况

- 1) 本周 PHC 管桩进场 2886 米，累计进场 39143 米。

3、安全、文明生产情况

- 1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。

4、阶段验收

- 1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

- 1) 大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 200 根。
- 2) 大观园区域鱼塘继续协调清淤、抽水等工作。
- 3) 其它鱼塘码头修建。
- 4) 设计图纸完成管桩基础设计初设、后续图纸设计中。

三、存在问题及需要协调事宜

- 1) 总包单位现场管理人员不够，需要增加。

四、监理工作情况

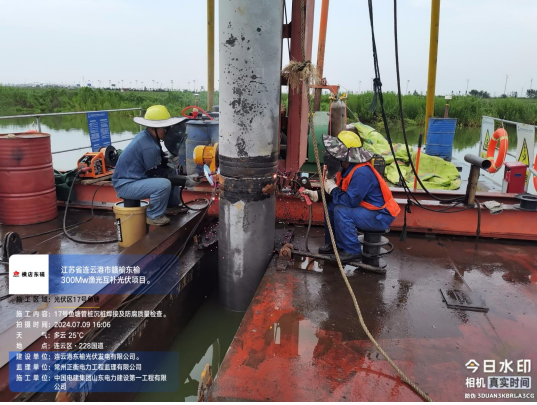
- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2) 对现场管桩材料质量进行检查，发现个别管桩不符合设计要求；存在漏浆、孔洞等现象，已要求总包单位退场处理。

3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，已要求现场人员进行整改。

四、现场影像资料

 江苏南通三泰新能源有限公司 300MW渔光互补光伏项目 施工内容: 12吨履带吊吊装管桩及沉桩质量检查。 拍摄时间: 2024.07.09 15:40 天气: 小雨 23℃ 地点: 海门区 225国道 建设单位: 连云港东瑞光伏投资有限公司 监理单位: 常州三泰电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏南通三泰新能源有限公司 工程管理部 今日水印 相机 真实时间	 江苏南通三泰新能源有限公司 300MW渔光互补光伏项目 施工内容: 12吨履带吊吊装管桩及沉桩质量检查。 拍摄时间: 2024.07.09 16:06 天气: 小雨 23℃ 地点: 海门区 225国道 建设单位: 连云港东瑞光伏投资有限公司 监理单位: 常州三泰电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏南通三泰新能源有限公司 工程管理部 今日水印 相机 真实时间
现场管桩打桩、焊接施工	
 江苏南通三泰新能源有限公司 300MW渔光互补光伏项目 施工内容: 12吨履带吊吊装管桩及沉桩质量检查。 拍摄时间: 2024.07.09 16:16 天气: 多云 23℃ 地点: 海门区 225国道 建设单位: 连云港东瑞光伏投资有限公司 监理单位: 常州三泰电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏南通三泰新能源有限公司 工程管理部 今日水印 相机 真实时间	 江苏南通三泰新能源有限公司 300MW渔光互补光伏项目 施工内容: 12吨履带吊吊装管桩及沉桩质量检查。 拍摄时间: 2024.07.12 15:39 天气: 多云 31℃ 地点: 海门区 225国道 建设单位: 连云港东瑞光伏投资有限公司 监理单位: 常州三泰电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏南通三泰新能源有限公司 工程管理部 今日水印 相机 真实时间
现场管桩焊接处防腐施工	现场管桩材料进场
