

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-12

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 12 期）

2024 年 08 月 13 日

—

2024 年 08 月 19 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 08 月 19 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 73 根，累计完成 2089 根。累计完成率 81.22%。

2) 本周 1#塘锚杆桩施工浇筑累计完成 167 根，累计完成 280 根，累计完成率 40%。

3) 大观园区域其它鱼塘清淤及抽水及相关协调。

2、主要材料、设备到货情况

1) 本周 PHC 管桩进场 1534 米，累计进场 44163 米。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。

4、阶段验收

1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

1) 大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 200 根。

2) 锚杆桩施工 150 根。

3) 大观园区域鱼塘继续协调清淤、抽水等工作。

4) 设计图纸完成管桩基础设计初设、后续图纸设计中。

三、存在问题及需要协调事宜

1) 总包单位现场管理人员不够，需要增加。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场管桩材料质量进行检查，发现个别管桩不符合设计要求；存在漏浆、孔洞等现象，已要求总包单位退场处理。
- 3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，已要求现场人员进行整改。

四、现场影像资料



江苏省连云港市赣榆东榆300MW渔光互补光伏项目。

施工区域: 光伏区8号桩位

施工内容: 桩基打桩施工。

拍摄时间: 2024.08.13 16:49

天气: 晴 32℃

地点: 连云港·402省道

建设单位: 连云港东榆光伏发电有限公司。

监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司。

施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司。

今日水印 相机 真实时间



江苏省连云港市赣榆东榆300MW渔光互补光伏项目。

施工区域: 光伏区19号桩位

施工内容: 桩基打桩施工。

拍摄时间: 2024.08.15 09:33

天气: 多云 29℃

地点: 连云港市赣榆区


建设单位: 连云港东榆光伏发电有限公司。

监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司。

施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司。

今日水印 相机 真实时间

现场管桩打桩、焊接施工

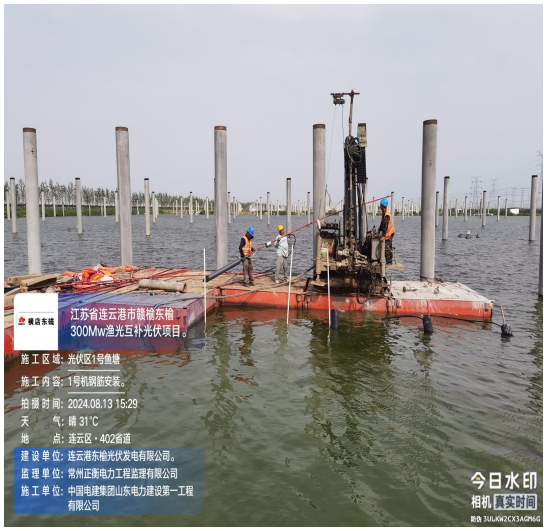

江苏省连云港市赣榆东榆300MW渔光互补光伏项目。

施工区域: 光伏区1号桩位

施工内容: 1号机副架安装。

拍摄时间: 2024.08.13 15:29

天气: 晴 31℃

地点: 连云港·402省道

建设单位: 连云港东榆光伏发电有限公司。

监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司。

施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司。

今日水印 相机 真实时间



东榆300MW渔光互补光伏发电项目

建设单位: 连云港东榆光伏发电有限公司

监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

出租: 13776089888 浮箱出租: 13776089888

今日水印 相机 真实时间

现场锚杆桩施工
