

监 理 周 报

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

2024 年 09 月 第 11 期

(2024 年09月07日 至 2024年09月13日)

项目监理部（章）



总监理工程师：张献兵

报告日期：2024年09月13日

监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期71天；安全生产71天。本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，若发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
8. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。已在施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘要求进行有序的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
- 8、现场安全隐患做好排查和管控，主要有、施工方人员资质（组织机构，人员名册，特殊工种证）施工方案（含安全措施）保险、体检及无犯罪记录，应急预案、专项施工方案。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无	2份	18人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	混凝土墩子	2024年7月1日	2024年7月4日	已完成100%
2	支架	2024年7月4日	2024年7月20日	已完成10. 3%
3	直流电缆	2024年8月20日	施工中	已完成1. 5%
4	组件	2024年7月23日	施工中	已完成15%
5	逆变器			
6	接地扁铁			
7	桥架			
8	交流电缆			
9	箱变			
10	一二次设备			

三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	BIPV屋面安全防护措施安装，封边瓦固定。几字形底座散料，BIPV组件安装，防护围栏安装、电缆放线、其他辅材安装、现场电缆沟破路。	进场材料检查，加固施工，BIPV支架安装，BIPV组件安装，电缆放线、吊装作业旁站、现场电缆沟破路。
安全管理	施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，现场防暑物资已备，本周安全可控。	对现场未闭环安全事宜监督闭环，屋面防暑物资落实情况，现场安全围栏等防护措施到位检查，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。
质量管理	现场加固檩条安装及拉条安装检查。 一分厂采光瓦屋面屋面支架安装，组件安装防水处理安全防护检查、组件安装检查、直流电缆检查、电缆沟破路检查。	按照图纸设计施工、施工工艺、规范要求施工，巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应。
物资供应	电缆埋管进场、组件进场	其他辅材进场

四、施工质量问题情况：

- 1、MC4接头绑扎不到位

五、施工安全问题情况

1、吊装作业做好吊装交底，吊装区域设置警示标识标语，安全员在岗指挥，特别注意吊装伤害、高空坠物、吊带检查。

1、现场彩钢瓦屋面施工开始，生命线已架设完成，现要求施工人员进入施工区域保证每人安全带与生命线及防坠器挂接牢固有效，做好持久性检查监督。

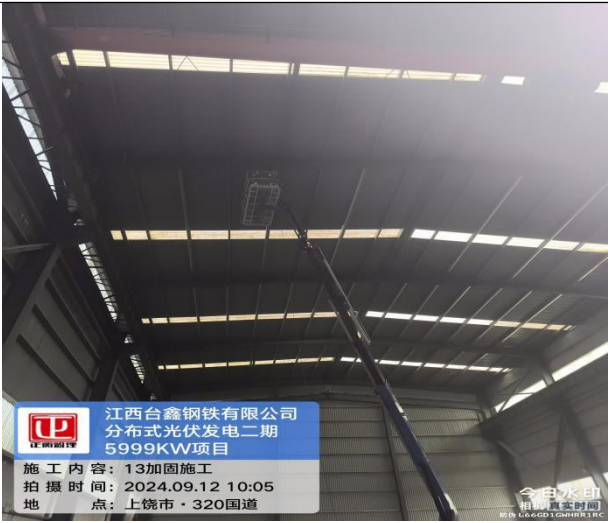
六、监理工作情况

- 1、每周安全质量监理检查。
- 2、日常巡视检查。
- 3、监理日志及会议纪要整理。
- 4、施工报审资料审核。

5、资料完善并上传系统

七、其他事宜：

八、工程形象进度照片

监理例会  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 监理例会 拍摄时间: 2024.09.13 15:02 地点: 未授权位置	安全例会学习  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 安全学习 拍摄时间: 2024.09.13 14:59 地点: 未授权位置
一分厂补漏  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 现场巡视一分厂 拍摄时间: 2024.09.13 08:46 地点: 上饶市·320国道	13#厂房加固  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 13加固施工 拍摄时间: 2024.09.12 10:05 地点: 上饶市·320国道
加固材料检查  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 13加固材料检查 拍摄时间: 2024.09.12 09:46 地点: 上饶市·320国道	加固材料检查  江西台鑫钢铁有限公司 分布式光伏发电二期 5999KW项目 施工内容: 13加固材料检查 拍摄时间: 2024.09.12 09:48 地点: 上饶市·傅家
一分厂组件吊装	15-16加固验收



一分厂现场巡视



一分厂现场巡视



常州正衡电力工程监理有限公司

江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目项目监理项目部

2024 年 09月13日
