

监 理 周 报

工程名称：京能科技本特勒2MW分布式光伏发电项目

2024 年 05 月 第 1 期

(2024 年05月11日 至 2024年05月17日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2024 年05月17日

监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期7天；安全生产7天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
8. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
- 8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		6人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	安全围栏	2024. 05. 01	2024. 05. 07	已完成100%
2	运维通道	2024. 05. 08	2024. 05. 13	已完成96%
3	夹具安装	2024. 05. 11	2024. 05. 14	已完成100%
4	导轨安装	2024. 05. 15		已完成80%
5				
6				

三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	屋面定位放线夹具、导轨安装，夹具做抗拉拔试验。	夹具导轨安装完成，直流桥架安装完成、接地扁铁安装完30%
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	彩钢瓦屋面扣件及连接件安装工艺达标；逆变器安装位置符合要求；桥架安装按图施工；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道全部进场，其余材料采购中。	无

四、施工质量问题情况：

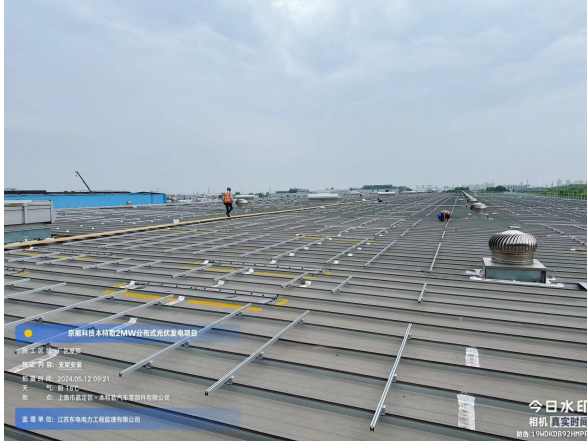
- 1、现场个别区域走道板连接处不牢固。

五、施工安全问题情况

- 1、进入施工现场时未设置安全警示标牌。

六、监理工作情况

- 1、监理前期资料的编撰。
- 2、日常巡视检查。
- 3、每周安全监理检查记录
- 4、夹具安装平行检验
- 5、导轨安装平行检验

夹具检查 	导轨检查 
导轨安装 	夹具抗拉拔试验 
桥架检查 	接地扁铁检查 
边压块检查	中压块检查



江苏东电电力工程监理有限公司
京能科技本特勒2MW分布式光伏发电项目监理项目部
2024年05月17日
