

监 理 周 报

工程名称：京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目

2024 年 08 月 第 10 期

(2024 年08月17日 至 2024年08月23日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2024 年08月23日

监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期70天；安全生产70天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		35人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	车棚基础	2024. 06. 15		已完成80%
2	水泥屋面支墩	2024. 06. 16	2024. 07. 23	已完成100%
3	夹具安装	2024. 06. 29	2024. 07. 31	已完成100%
4	车间加固	2024. 07. 09		已完成85%
5	安全围栏安装	2024. 07. 05		已完成93%
6	导轨安装	2024. 07. 12	2024. 07. 31	已完成100%
7	走道板安装	2024. 07. 13		已完成90%
8	桥架安装	2024. 07. 30		已完成70%
9	直流电缆敷设	2024. 08. 01		已完成85%
10	逆变器支架	2024. 07. 30		已完成70%
11	组件吊装分散	2024. 08. 10		已完成45%

12	组件安装	2024. 08. 17		已完成25%
13	车棚钢结构安装	2024. 08. 22		已完成20%

三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	联合厂房组件安装、主车间逆变器支架安装、直流电缆敷设，桥架安装。2#5#车棚钢筋绑扎及沉台浇筑1#车棚基础钢筋绑扎，4#车棚钢结构安装，主车间车间加固。	主车间车间加固，主车间走道板，安全围栏，逆变器支架完成100%，桥架完成80%，直流电缆完成100%，水泥屋面支架、组件安装完成100%，1#2#5#车棚基础沉台短柱绑扎完成100%，4#车棚钢结构安装完成100%。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	彩钢瓦屋面扣件及连接件安装工艺达标；逆变器安装位置符合要求；桥架安装按图施工；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	运维通道到货100%、夹具进场100%、导轨进场100%、水泥屋面支架进场100%，加固材料进场100%，接地扁铁角铁进场100%，压块进场100%，直流电缆进场80%，交流电缆进场60%，组件进场45%，逆变器进场100%，其余材料采购中。	无

四、施工质量问题情况：

- 1、联合厂房直流电缆敷设绑扎间隔过大。

五、施工安全问题情况

- 1、2#5#车棚预埋螺栓焊接固定时未配备灭火器
- 2、车棚现场施工人员发现多次未佩戴安全帽

六、监理工作情况

- 1、日常巡视检查。
- 2、每周监理检查记录
- 3、检查对已发现问题整改情况
- 4、旁站2#5#车棚基础沉台浇筑
- 5、组织现场人员进行安全技术交底会议
- 6、检查1#2#5#车棚底板钢筋绑扎质量
- 7、检查现场直流电缆敷设情况
- 8、检查组件安装质量情况

七、其他事宜：

- 1、无。

八、工程形象进度照片

4#车棚立柱安装及调平 	业主现场巡视 
5#车棚预埋螺栓安装 	桥架安装 

组织安全技术会议



2#5#车棚沉台浇筑




直流电缆敷设绑扎



组件安装



1#2#5#车棚钢筋绑扎

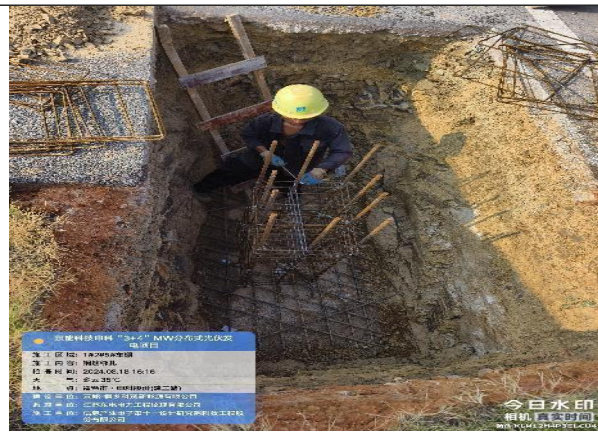

走道板安装



江苏东电电力工程监理有限公司

京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目监理项目部

2024年08月23日
