

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目		
填报日期	2024 年 08 月 16 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	0.5% 0.5%		
本周下雨天数	0 天	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、大众广场一期和大众广场二期二期区域屋顶进行定位放线，完成约 50%；防水卷材裁剪完成约 25%。 2、大众广场一期区域内需利用电缆管路进行查勘，查勘结果继续与建设单位和设计单位进行沟通，基本统一意见。 3、施工图纸会审和施工相关事宜沟通会议已召开，图纸会审纪要正在编制中。 4、项目部进驻大众广场二期工程二期区域，办公用设施就位，项目部五牌一图已张贴，项目部具备办公条件。进场施工相关事宜逐步落实办理。 5、施工单位和监理单位的项目前期文件正在加紧编写（因涉及到部分设计进行了更改），适时报建设单位批准。		
投资情况	本周屋顶防水卷材材料进场，价值约 1.0 万元，施工单位人员进行开工前相关准备工作，施工劳务约 1.5 万元，合计完成约 2.5 万元，约占总合同价的约 0.63%(按合同价 394.98 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、大众广场一期、大众广场二期一期和大众广场二期二期区域十八栋楼屋顶定位放线完成 100%。 2、大众广场一期和大众广场二期二期条形基础和支墩安放（含卷材）完成约 30%。 3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工。		

	4、施工人员进入施工现场确认并做好安全文明施工交底，做好消防和安全防范工作，做好现场的安全文明施工工作，做好防暑降温工作。 5、施工前期及进场报审资料提交审核。
周工作小结	进入现场施工的协调工作得以落实，积极做好消防和其他安全文明施工的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施；项目部建立并进行布置。材料开始进场，施工有序开始。
需要协调问题	1、尽快落实图纸会审及相关事宜。

目前进度：

1、大众广场一期和大众广场二期二期区域屋顶进行定位放线，完成约 50%；防水卷材裁剪完成约 25%。

2、大众广场一期区域内需利用电缆管路进行查勘，查勘结果继续与建设单位和设计单位进行沟通，基本统一意见。

3、施工图纸会审和施工相关事宜沟通会议已召开，图纸会审纪要正在编制中。

4、项目部进驻大众广场二期工程二期区域，办公用设施就位，项目部五牌一图已张贴，项目部具备办公条件。进场施工相关事宜逐步落实办理。

5、施工单位和监理单位的项目前期文件正在加紧编写（因涉及到部分设计进行了更改），适时报建设单位批准。

投资情况：

本周屋顶防水卷材材料进场，价值约 1.0 万元，施工人员进行开工前相关准备工作，施工劳务约 1.5 万元，合计完成约 2.5 万元，约占总合同价的约 0.63%（按合同价 394.98 万元计算）。

下步计划：

1、大众广场一期、大众广场二期一期和大众广场二期二期区域十八栋楼屋顶定位放线完成 100%。

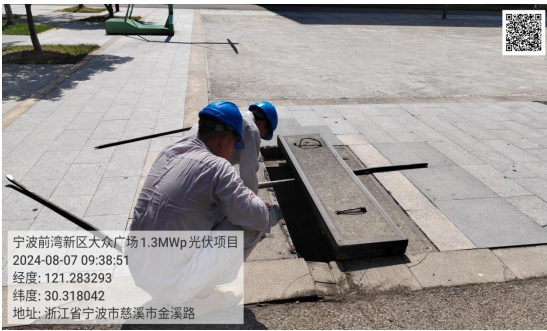
2、大众广场一期和大众广场二期二期条形基础和支墩安放完成约 30%。

3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工。

4、施工人员进入施工现场确认并做好安全文明施工交底，做好消防和安全防范工作，做好现场的安全文明施工工作，做好防暑降温工作。

5、施工前期及进场报审资料提交审核。

附现场照片：

文字描述	大众广场一期俯瞰图		大众广场二期一期区域俯瞰图	
照片				
文字描述	大众广场二期二期区域俯瞰图		大众广场一期电缆沟管道查勘一	
照片			 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-07 08:31:01 经度: 121.283765 纬度: 30.317737 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	
文字描述	大众广场一期电缆沟管道查勘二		项目部成立张贴五牌一图	
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-07 09:38:51 经度: 121.283293 纬度: 30.318042 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路		 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-08 16:18:38 经度: 121.283717 纬度: 30.320933 地址: 浙江省宁波市慈溪市越人路	
文字描述	大众广场一期屋顶放线一		大众广场一期屋顶放线二	
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-14 16:12:59 经度: 121.282599 纬度: 30.317724 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路		 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-14 16:16:00 经度: 121.282767 纬度: 30.317697 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	

文字描述	防水卷材到货	防水卷材合格证
照片	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-08-16 08:51:32 经度: 121.284201 纬度: 30.320791 地址: 浙江省宁波市慈溪市越人路	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-08-16 08:54:32 经度: 121.284133 纬度: 30.320769 地址: 浙江省宁波市慈溪市越人路
