

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目		
填报日期	2024 年 09 月 06 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	6.5% 6.5%		
本周下雨天数	0 天	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、大众广场一期区域八栋楼屋顶支墩分散就位摆放完成 100%，支架安装完成约 30%。 2、三个区域的支架材料（包括固定螺丝和组件固定压块等）到货 50 余件，到货完成 100%。 3、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周支架材料（含各种紧固件等）到货进场，价值约 23.6 万元；施工劳务约 2.0 万元，合计完成约 35.6 万元，约占总合同价的约 9.0%(按合同价 394.98 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、大众广场一期区域八栋楼屋顶支架安装完成 100%。 2、大众广场二期二期块条形基础和支墩安放（含卷材）完成约 50%；支架安装视情况完成约 20%。 3、大众广场二期一期楼顶的空拉梁材料进场，进行试安装。 4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温工作。 5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。		
周工作小结	进入现场施工工作较顺利，积极做好消防和其他安全文明施工的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施落实。支架材料开始进场，施工正常进行。		
需要协调问题	1、落实屋顶不锈钢排气管高度影响支架安装的相关事宜。		

目前进度：

- 1、大众广场一期区域八栋楼屋顶支墩分散就位摆放完成 100%，支架安装完成约 30%。
- 2、三个区域的支架材料（包括固定螺丝和组件固定压块等）到货 50 余件，到货完成 100%。
- 3、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

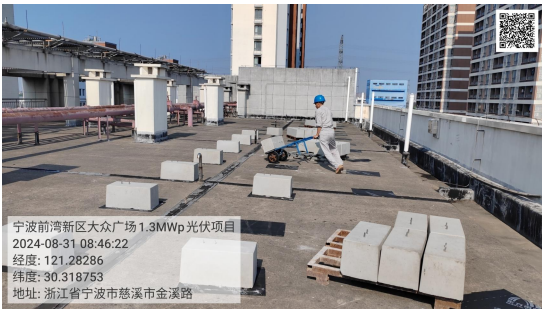
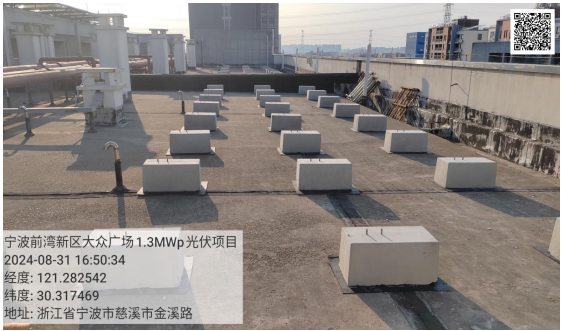
本周支架材料（含各种紧固件等）到货进场，价值约 23.6 万元；施工劳务约 2.0 万元，合计完成约 35.6 万元，约占总合同价的约 9.0%(按合同价 394.98 万元计算)。

下步计划：

- 1、大众广场一期区域八栋楼屋顶支架安装完成 100%。
- 2、大众广场二期二期块条形基础和支墩安放（含卷材）完成约 50%；支架安装视情况完成约 20%。
- 3、大众广场二期一期楼顶的空拉梁材料进场，进行试安装。
- 4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温工作。
- 5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	支架到货情况	支架卸货情况
照片	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-08-30 15:50:57 经度: 121.284677 纬度: 30.319514 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-08-30 15:47:50 经度: 121.284771 纬度: 30.319527 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路

文字描述	支墩进行分数就位一	支墩进行就位摆放成型
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-31 08:46:22 经度: 121.28286 纬度: 30.318753 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-08-31 16:50:34 经度: 121.282542 纬度: 30.317469 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路
文字描述	方阵端头支架进行定位安装一	方阵支架进行安装二
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-01 17:07:30 经度: 121.283456 纬度: 30.317463 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-06 09:06:31 经度: 121.282864 纬度: 30.31715 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路
文字描述	一期屋顶进行支架吊运一	一期屋顶进行支架吊运二
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-03 08:38:11 经度: 121.283325 纬度: 30.317368 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-03 16:39:19 经度: 121.283777 纬度: 30.318382 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路
