

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目		
填报日期	2024 年 09 月 20 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	15% 15%		
本周下雨天数	3 天	实际可施工天数	4 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、大众广场一期支墩基础摆放就位（含卷材）和支架安装完成约 80%。 2、大众广场二期一期块楼顶的空拉梁钢梁安装完成约 60%。 3、大众广场二期二期块第二批条形基础到货，到货完成 100%。 4、卷材和砼试块完成送第三方检测站送样，待检测报告。 5、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。 6、本周经历了两次台风的袭扰，停工近两天。		
投资情况	本周砼条形基础到货进场，价值约 7.0 万元；施工劳务约 2.0 万元，累计完成约 199.1 万元，约占总合同价的约 50.41%(按合同价 394.98 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、大众广场二期二期块条形基础就位摆放（含卷材）和支架完成 100%；二期二期块和一期块楼顶空拉钢梁安装完成 100%；视情况二期二期块组件进行安装完成约 50%。 2、大众广场一期块楼顶的支架安装完成 100%。 3、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温和防台风工作。 4、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。		
周工作小结	进入现场施工工作较顺利，积极做好消防和其他安全文明施工的教育宣贯，加强消防和防范台风安全措施落实，本周因防台停工两天。其他施工继续进行。		

需要协调问题	1、落实屋顶不锈钢排气管高度影响支架安装的相关事宜。 2、大众二期的两个区块屋顶“葡萄架”钢梁安装影响避雷带连接事宜。
--------	--

目前进度：

- 4、大众广场一期支墩基础摆放就位（含卷材）和支架安装完成约 80%。
- 2、大众广场二期一期块楼顶的空拉梁钢梁安装完成约 60%。
- 3、大众广场二期二期块第二批条形基础到货，到货完成 100%。
- 4、卷材和砼试块完成送第三方检测站送样，待检测报告。

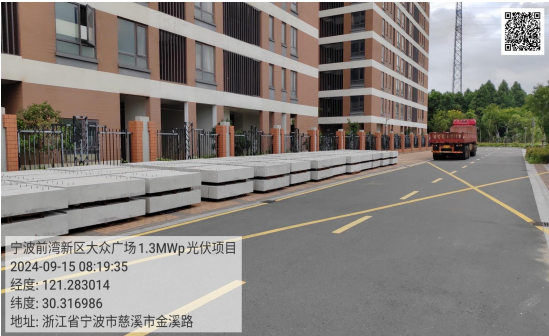
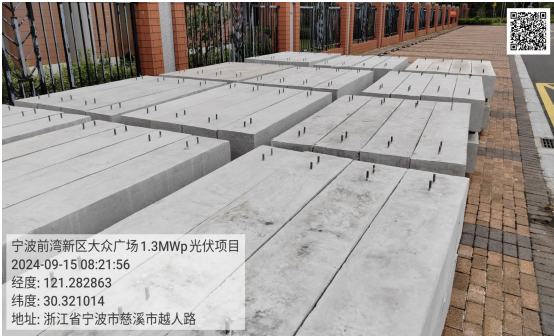
投资情况：

本周砼条形基础到货进场，价值约 7.0 万元；施工劳务约 2.0 万元，累计完成约 199.1 万元，约占总合同价的约 50.41%(按合同价 394.98 万元计算)。

下步计划：

- 1、大众广场二期二期块条形基础就位摆放（含卷材）和支架完成 100%；二期二期块和一期块楼顶空拉钢梁安装完成 100%；视情况二期二期块组件进行安装完成约 50%。
- 2、大众广场一期块楼顶的支架安装完成 100%。
- 3、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温和防台风工作。
- 4、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	砼条形基础材料到货情况	砼条形基础材料查看
照片	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-09-15 08:19:35 经度: 121.283014 纬度: 30.316986 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场 1.3MWp 光伏项目 2024-09-15 08:21:56 经度: 121.282863 纬度: 30.321014 地址: 浙江省宁波市慈溪市越人路

文字描述	大众广场一期屋顶支架斜梁安装情况	台风过境后现场进行检查
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-18 17:42:17 经度: 121.284134 纬度: 30.317899 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-16 15:37:09 经度: 121.284365 纬度: 30.319748 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路
文字描述	二期二区块屋顶进行组件吊运	二期一区块屋顶进行组件吊运
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-20 09:29:08 经度: 121.283398 纬度: 30.319729 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-20 09:00:28 经度: 121.283959 纬度: 30.31966 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路
