

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2024. 12. 04-2024. 12. 10



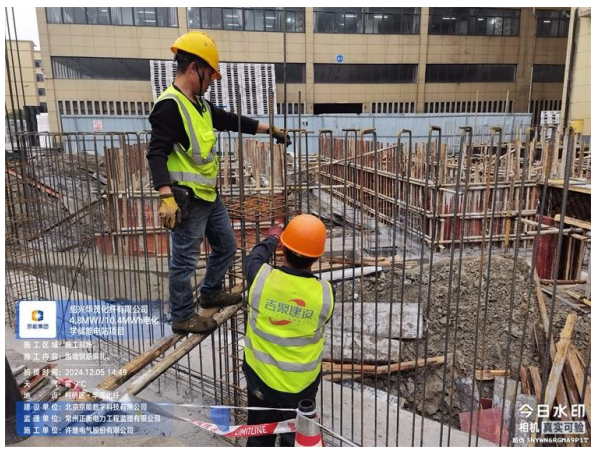
绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2024 年 12 月 10 日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2024-12-04-2022-12-10 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、升压变流舱基础浇筑 100% 2、电池预制舱基础浇筑 100% 3、电缆沟基础浇筑 100% 4、围墙基础承台浇筑 70% 5、集水井基础浇筑 100% 6、基础上沿预埋件安装 100% 7、施工场地清理。 8、围墙基础定位放线 9、围墙基础钢筋绑扎 70% 10、1#升压变流舱基础模板、2#升压变流舱基础模板、3#升压变流舱基础模板、4#升压变流舱基础模板、1#电池预制舱基础模板拆除、2#电池预制舱基础模板拆除 11、电缆沟模板制作 100% 12、电缆沟模板支设 100% 13、电缆沟预埋件焊接 100% 14、围墙剪力墙及构造柱模板加固 80% 15、电缆沟模板加固 100% 16、混凝土养护。 17、防水涂料处理。 18、部分渣土回填。 19、接地扁铁、接地极、接地引上线的铺设、焊接及防腐处理 95% 20、同厂区协调相关事宜，开具动火票；确认原厂区 35kV 配电房卫生间改造相关问题：确认其卫生间水管可拆除、确认进水阀位置。 21、厂区路面卫生清洁维护 22、同厂区相关人员沟通获取配电房蓝图压缩转交予设计院参考。 23、就施工现场部分问题向设计院询问及解决。 24、资料整理。	
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。	
三、下周计划主要工作内容 1、围墙剪力墙及构造柱混凝土浇筑。 2、电缆沟浇筑 100% 3、混凝土养护。 4、围墙模板拆除。 5、模板支撑拆除。 6、围墙砌筑。 7、设备基础回填。 8、消防管道埋设。	

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	设备基础混凝土浇筑	70%围墙剪力墙及加墙柱钢筋安装
照片		
文字描述	设备基础模板拆除	接地网扁铁焊接
照片		
文字描述	接地网扁铁焊接及防腐检查	70%围墙及加强柱模板安装加固
照片		
