

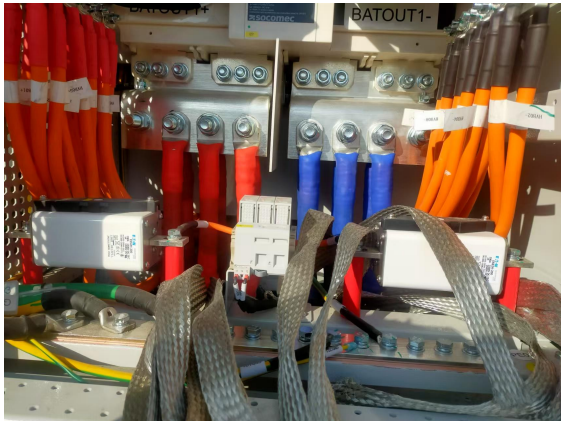
淮安储能项目工程建设周报

2024 年第九周

项目名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目		填报周期：2024 年 12 月 9 日 -2024 年 12 月 15 日	
一、本周现场人员情况			
	单位名称	人员分类	人数
建设单位	淮安和淮储能科技有限公司	现场管理人员	1
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	工程管理人员	3
		现场施工工人	26
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2
二、物资到货情况			
1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱进场，电缆进场 100%，电缆支架进场 100%，雨水井进场，电缆沟盖板进场			
三、施工情况			
1、电缆沟砌筑、粉刷完成			
2、电缆沟内支架安装完成			
3、电池舱吊装 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱吊装完成			
4、110KV 天能变改造完成			
5、站内消防管道埋设完成，主管与厂区主管对接完成			

- 6、电池舱组簇接线完成，测试完成 100%
 - 7、接地环网主网连接完成
 - 8、电缆敷设站内完成 100%，高压电缆敷设 70%，高压电缆铜鼻子制作完成 50%
 - 9、一次、二次设备舱内屏柜调试完成 100%
 - 10、三道防爆墙基础施工完成，围墙基础砌筑完成
- 四、质量方面
- 1、消防水管回填底部未使用黄沙做垫层保护，已整改
- 五、进度方面
- 1、消防管道施工完成
 - 2、高压电缆敷设滞后 1 天
 - 3、高压电缆终端制作滞后 1 天
- 五、安全情况
- 1、现场安全文明施工基本符合要求
- 六、监理管理
- 2、本周安全检查一次
 - 3、召开监理例会一次

工程现场照片：

	
---	--

 08:36 2024-12-14 星期六 晴 -2°C 淮安市·天合光能(淮安)科技有限公司 项目名称: 天合光能光电一期22.5MW/45MWh二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目 施工内容: 二期消防管道打压试验 施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 相机 151010 品牌: E-10031-WH10-0106	
