

监 理 周 报

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目

2025 年 1月 第4期

(2024 年01月03日 至 2025年01月09日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2025 年01月09日

监 理 周 报

一、安全情况：

1. 开工工期28天；安全生产28天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全	施工	安全分包情况			
人身	机械	电网	策划文件	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
重伤	设备	事故	（份）		伍数量	伍人数	包队伍数量	队伍人数
无	无	无		6人	/	/	/	/

二、本周进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	夹具安装	2024. 12. 13		已完成80%
2	导轨安装	2024. 12. 14		已完成80%
3	运维通道安装	2024. 12. 17		已完成40%
4	桥架安装	2024. 12. 24		已完成23%
5	安全围栏	2025. 01. 01		已完成45%
6	加固工程2#3#车间	2024. 11. 01		已完成50%
7				
8				
9				
10				

三、施工重点工作情况

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	安全围栏安装、运维通道安装、桥架组装及安装。	安全围栏安装全部完成、运维通道安装完成80%、直流桥架安装80%、接地扁铁完成20%、预计下周加固人员材料设备进场。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本周安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	彩钢瓦屋面扣件及连接件安装工艺达标；逆变器安装位置符合要求；桥架安装按图施工；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
物资供应	夹具，导轨、组件、桥架、接地扁铁、运维通道、安全围栏、中压边压块全部到货。加固材料3#车间材料全部进场、其他材料采购中。	无

四、施工质量问题情况：

- 1、现场围栏安装屋脊处存在高度差，围栏横杆安装时需要解决方案。
- 2、现场围栏安装过程中个别区域因原来厂区结构影响不易夹具安装，需要解决方案。

五、施工安全问题情况

- 1、现场工人临边作业安全措施不符合要求。
- 2、每天早晨天气寒冷、屋面霜冻湿滑，要求上屋面前对工人进行安全交底。

六、监理工作情况

- 1、日常巡视检查
- 2、每周安全监理检查记录
- 3、检查现场运维通道安装情况
- 4、检查安全围栏安装质量情况
- 5、现场直流桥架安装质量情况
- 6、对现场问题整改情况进行检查

七、其他事宜：

- 1、无。

八、工程形象进度照片



运维通道安装




阳极氧化膜检查



阳极氧化膜检查



安全围栏安装

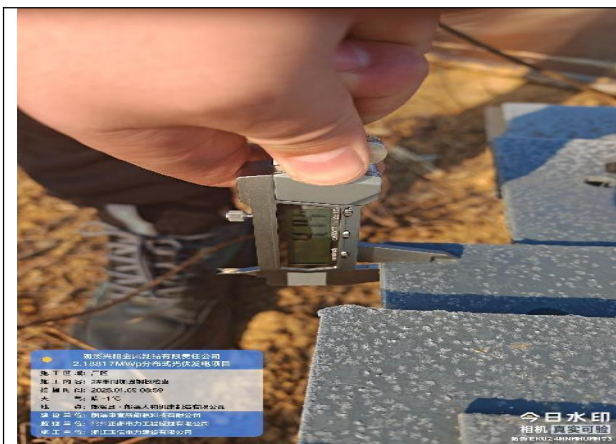


2#车间加固材料检查



2#车间加固材料检查



2#车间加固材料检查

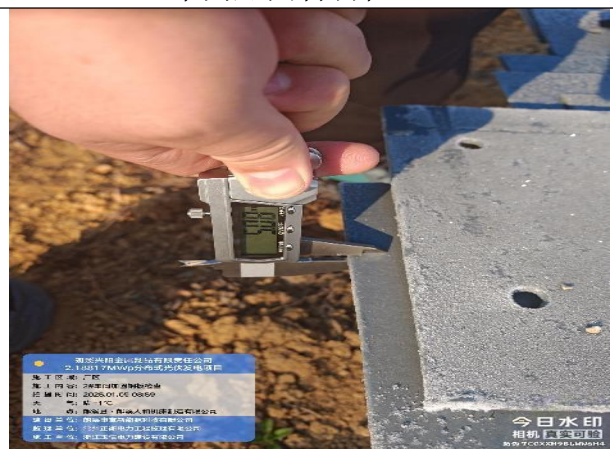

2#车间加固材料检查



直流桥架安装

常州正衡电力工程监理有限公司

郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目

监理项目部

2025年01月09日
