

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 03 月 28 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	0.0% 0.0%		
本周下雨天数	1 天	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、施工单位和园区总包单位及建设单位沟通协调进场事宜，基本达成初步意见。 2、本周主要完成项目部建设、机械进场及人员就位工作。提交相关证明，项目部办公场所已布置完毕，具备办公条件；施工机械已停放至指定位置；施工人员已集合到位，但尚未开展实质性施工工作。 3、对条形支墩基础的采购计划和质量，已完成材料进场和施工工序质量等资料的报验。 4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周无工程计量及投资情况。		
下步计划	下周计划： 1、计划开展项目正式施工工作，包括基础施工前期测量放线等准		

	备工作，安排施工人员进行安全及技术交底培训。 2、严格把控防水卷材等材料进场质量检验工作。 3、根据现场园区地面施工条件影响，调整施工进度计划。 4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。 5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
周工作小结	本周继续协调入场施工事宜，尚未进入实体工程施工阶段。施工单位项目部建设和施工准备正常进行。
需要协调问题	协调入场施工时间的确定。

目前进度：

- 1、施工单位和园区总包单位及建设单位沟通协调进场事宜，基本达成初步意见
- 2、本周主要完成临时设施搭建、机械进场及人员就位工作。提交相关证明，项目部办公场所已布置完毕，具备办公条件；施工机械已停放至指定位置；施工人员已集合到位，但尚未开展实质性施工工作。
- 3、对条形支墩基础的采购计划和质量，已完成材料进场和施工工序质量等资料的报验。
- 4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

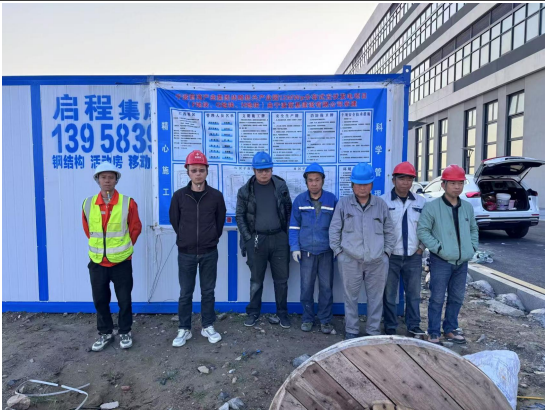
本周无工程计量及投资情况。

下步计划：

- 1、计划开展项目正式施工工作，包括基础施工前期测量放线等准备工作，安排施工人员进行安全及技术交底培训。

- 2、严格把控防水卷材等材料进场质量检验工作。
- 3、根据现场园区地面施工条件影响，调整施工进度计划。
- 4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。
- 5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	人员到场	办公场所布置
照片		
文字描述	办公设施	施工机械设备
照片	
