

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 04 月 25 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	9.25% 0.25%		
本周下雨天数	1 天	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、本周材料进场情况,F 地块 1#和 2#楼顶楼支架材料到场齐全，价值约 4.0 万元；F 地块桥架到货齐全,价值约 3.0 万元；F 和 H 地块组件到货齐全价值约 191.0 万元；本周材料设备进场价值合计约 198.0 万元。 2、F 地块 1#和 2#顶层防水卷材、条形支墩、支架和组件已吊装完成。 3、H 地块 1#和 3#-5 层/7 层以及 2#楼屋顶的定位划线完成。 4、组件到货完成了 EL 检测，具体结果待报告出具。 5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周材料投资情况：组件组件，价值约 191.0 万元，支架进场，价值约 4.0 万元，桥架进场，价值约 3.0 万元，合计 198 万元。截止		

	目前所有设备材料价值累计约 268.0 万元。 本周已完工程投资情况：施工安装量约 0.5 万元，人工费约 1.5 万元，机械费约 0.5 万元，措施项目费约 0.2 万元，合计完成工程量 2.7 万元，占比约 0.25%，截止目前累计完成工程量 16.8 万元，占比约 1.56%。截止目前总投资合计约 268.0(设备材料)+9.3(劳务机械)=277.3 万元，约占总合同价的 25.7%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	下周计划： 1、F 地块 1#和 2#顶楼条形基础摆放和支架安装完成 100%。 2、F 地块 1#和 2#楼/5 层/7 层/顶层组件安装完成 100%。 3、H 地块 2#楼屋面条形基础、支架和组件吊装作业完成 100%。 4、继续进其他材料和设备的相关采购工作。 5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。 6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
周工作小结	本周质量管控，组件已按要求已进行现场 EL 检测；光伏支架材料镀锌层厚度和桥架材料已进行检验；组件品牌、规格符合要求。安全措施落实，严格执行吊装作业安全规范，设置警戒区域，配备专职安全员全程监督，作业人员均佩戴安全帽等防护装备。进度管控，1#和 2#楼顶层吊装作业按计划有序进行。
需要协调问题	战 F 地块 5#-6#吊装作业点的吊装方案已提交，需继续沟通确认。

目前进度：

- 1、本周材料进场情况，F 地块 1#和 2#楼顶楼支架材料到场齐全，价值约 4.0

万元；F 地块桥架到货齐全,价值约 3.0 万元；F 和 H 地块组件到货齐全价值约 191.0 万元；本周材料设备进场价值合计约 198.0 万元。

- 2、F 地块 1#和 2#顶层防水卷材、条形支墩、支架和组件已吊装完成。
- 3、H 地块 1#和 3#-5 层/7 层以及 2#楼屋顶的定位划线完成。
- 4、组件到货完成了 EL 检测，具体结果待报告出具。
- 5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

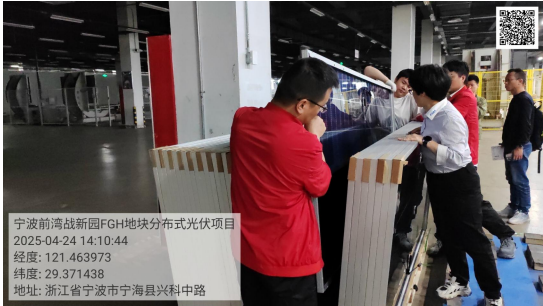
本周已完工程投资情况：施工安装量约 0.5 万元，人工费约 1.5 万元，机械费约 0.5 万元，措施项目费约 0.2 万元，合计完成工程量 2.7 万元，占比约 0.25%，截止目前累计完成工程量 16.8 万元，占比约 1.56%。截止目前总投资合计约 268.0（设备材料）+9.3（劳务机械）=277.3 万元,约占总合同价的 25.7%(合同价为 1079.89 万元)。

下步计划：

- 1、F 地块 1#和 2#顶楼条形基础摆放和支架安装完成 100%。
- 2、F 地块 1#和 2#楼/5 层/7 层/顶层组件安装完成 100%。
- 3、H 地块 2#楼屋面条形基础、支架和组件吊装作业完成 100%。
- 4、继续进其他材料和设备的相关采购工作。
- 5、施工人员进入现场佩戴好安全防护装备，落实好安全文明施工措施。
- 6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	桥架进场	卷材裁剪好待使用
------	------	----------

照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-20 14:13:34 经度: 121.256944 纬度: 30.365827 地址: 浙江省宁波市慈溪市	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-20 14:13:44 经度: 121.256926 纬度: 30.36577 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	F 地块 1#和 2#楼顶层支架到货	F 地块材料卸货
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-20 15:14:36 经度: 121.25743 纬度: 30.365781 地址: 浙江省宁波市慈溪市	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-20 15:14:54 经度: 121.257456 纬度: 30.36572 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	F 地块光伏组件到货	H 地块光伏组件到货
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-23 16:04:28 经度: 121.257444 纬度: 30.365565 地址: 浙江省宁波市慈溪市	 战新园FGH地块光伏 时间: 2025-04-24 15:14:15 经度: 121.257456 纬度: 30.365534 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	试验室送检组件取样	组件到货现场 EL 检测
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 14:10:44 经度: 121.463973 纬度: 29.371438 地址: 浙江省宁波市宁海县兴科中路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 19:14:31 经度: 121.256968 纬度: 30.365456 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路

文字描述	支墩吊装作业一	支墩吊装作业二
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 08:53:44 经度: 121.257114 纬度: 30.366052 地址: 浙江省宁波市慈溪市	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 08:58:15 经度: 121.257133 纬度: 30.365505 地址: 浙江省宁波市慈溪市
