

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 05 月 01 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	32.6% 8.6%		
本周下雨天数	0 天	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、本周设备和材料进场情况：F、G 和 H 地块接地扁钢材料到货齐全价值约 1.0 万元；G 地块桥架到货齐全价值约 4.5 万元，条形支墩到货齐全价值约 54.0 万元，支架及辅材到货齐全价值约 8.5 万元；本周设备和材料进场价值合计约 68.0 万元。 2、F 地块 1#和 2#顶层防水卷材铺垫、条形支墩摆放就位、支架和组件安装完成 100%。 3、H 地块 1#和 3#-5 层/7 层以及 2#楼屋顶的防水卷材、条形支墩、支架、组件和逆变器吊装完成 100%。 4、H 地块 1#和 3#-5 层/7 层以及 2#楼屋顶的防水卷材铺垫、条形支墩摆放就位完成 100%、支架安装完成约 50%。 5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		

投资情况	本周材料投资情况：本周设备和材料进场价值合计约 68.0 万元，截止目前所有设备材料价值累计约 336.0 万元。 本周已完工程投资情况：施工安装量约 85.5 万元，人工费约 3.5 万元，机械费约 3.0 万元，措施项目费约 0.5 万元，合计完成工程量 2.7 万元，占比约 8.6%，截止目前累计完成工程量 102.3 万元，占比约 10.0%。截止目前总投资合计约 336.0（设备材料）+16.3（劳务机械）=352.3 万元，约占总合同价的 32.6%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	下周计划： 1、F 地块 5#和 6#顶楼条形基础、支架和组件吊装完成 100%。 2、F 地块 5#和 6#顶楼条形基础摆放、支架和组件安装完成 100%。 3、H 地块三栋楼屋面条形基础摆放、支架和组件安装完成 100%。 4、继续进其他材料和设备的相关采购工作。 5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。 6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
周工作小结	本周主要以 H 地块三栋楼吊装作业为主，安全措施已落实，严格执行吊装作业安全规范，设置警戒区域，配备专职安全员全程监督，作业人员均佩戴安全帽等防护装备。进度管控，H 地块 1#、2#和 3#楼顶层吊装作业按计划有序进行。
需要协调问题	战 F 地块 5#-6#吊装作业点的吊装方案已提交，需继续沟通确认。

目前进度：

- 1、本周设备和材料进场情况：F、G 和 H 地块接地扁钢材料到货齐全价值约 1.0

万元；G地块桥架到货齐全价值约4.5万元，条形支墩到货齐全价值约54.0万元，支架及辅材到货齐全价值约8.5万元；本周设备和材料进场价值合计约68.0万元。

2、F地块1#和2#顶层防水卷材铺垫、条形支墩摆放就位、支架和组件安装完成100%。

3、H地块1#和3#-5层/7层以及2#楼屋顶的防水卷材、条形支墩、支架、组件和逆变器吊装完成100%。

4、H地块1#和3#-5层/7层以及2#楼屋顶的防水卷材铺垫、条形支墩摆放就位完成100%、支架安装完成约50%。

5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周材料投资情况：本周设备和材料进场价值合计约68.0万元，截止目前所有设备材料价值累计约336.0万元。

本周已完工程投资情况：施工安装量约85.5万元，人工费约3.5万元，机械费约3.0万元，措施项目费约0.5万元，合计完成工程量2.7万元，占比约8.6%，截止目前累计完成工程量102.3万元，占比约10.0%。截止目前总投资合计约336.0（设备材料）+16.3（劳务机械）=352.3万元，约占总合同价的32.6%（合同价为1079.89万元）。

下步计划：

1、F地块5#和6#顶楼条形基础、支架和组件吊装完成100%。

2、F地块5#和6#顶楼条形基础摆放、支架和组件安装完成100%。

3、H地块三栋楼屋面条形基础摆放、支架和组件安装完成100%。

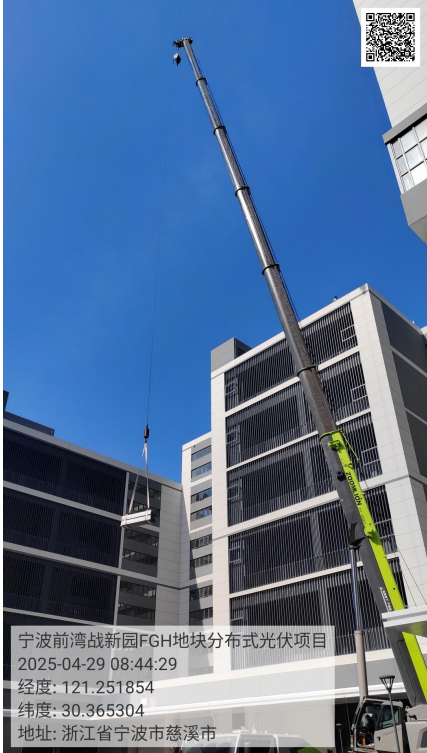
4、继续进其他材料和设备的相关采购工作。

5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好施工区域警示牌悬挂。

6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

附现场照片：

文字描述	支墩基础进场（H地块）	支架的斜梁安装完成
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-25 11:04:49 经度: 121.252615 纬度: 30.363799 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-26 15:06:15 经度: 121.251435 纬度: 30.364063 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路
文字描述	H地块 2#西侧楼吊装	H地块 2#东侧楼吊装
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-26 09:51:49 经度: 121.251076 纬度: 30.363763 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-27 08:50:57 经度: 121.25241 纬度: 30.363788 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路
文字描述	H地块 3#楼五层楼顶吊装	H地块 1#楼七层楼顶吊装

照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-28 08:34:45 经度: 121.252784 纬度: 30.364411 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-29 08:44:29 经度: 121.251854 纬度: 30.365304 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	H 地块 3#楼七层楼顶吊装	H 地块 3#楼顶楼吊装
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-30 07:48:17 经度: 121.251995 纬度: 30.364946 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-01 08:42:02 经度: 121.251807 纬度: 30.365788 地址: 浙江省宁波市慈溪市慈溪海塘
