

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 05 月 09 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	33% 13.5%		
本周下雨天数	2 天	实际可施工天数	5 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、本周设备和材料进场情况：没有新进材料和设备。2、H 地块 1#和 3#楼顶层的材料、组件和逆变器吊装完成 100%。3、H 地块 1#和 3#楼-5 层/7 层/顶层和 2#楼东侧/中部/西侧屋顶的支架和组件安装完成约 100%。4、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	<p>本周材料投资情况：本周没有设备和材料进场，截止目前所有设备材料价值累计约 336.0 万元。</p> <p>本周已完工程投资情况：施工安装量约 142.1 万元，人工费约 2.5 万元，机械费约 1.0 万元，合计完成工程量 145.6 万元，占比约 13.5%，截止目前累计完成工程量 247.9 万元，占比约 23.0%。截止目前总投资合计约 336.0（设备材料）+19.8（劳务机械）=355.8 万元，约占</p>		

	总合同价的 33.0%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	<p>下周计划：</p> <p>1、F 地块 5#和 6#顶楼材料、组件和逆变器吊装以及安装完成 100%。</p> <p>2、G 地块视情况择机进场施工。</p> <p>3、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。</p> <p>4、施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。</p>
周工作小结	<p>本周主要以 H 地块三栋楼材料设备吊装和支架组件安装作业为主，安全措施已落实，严格执行吊装作业安全规范，设置警戒区域，配备专职安全员全程监督，作业人员均佩戴安全帽等防护装备。进度管控，H 地块 1#、2#和 3#楼吊装作业按计划有序进行。</p>
需要协调问题	战 G 地块进场事宜，需继续沟通确认。

目前进度：

- 1、本周设备和材料进场情况：没有新进材料和设备。
- 2、H 地块 1#和 3#楼顶层的材料、组件和逆变器吊装完成 100%。
- 3、H 地块 1#和 3#楼-5 层/7 层/顶层和 2#楼东侧/中部/西侧屋顶的支架和组件安装完成约 100%。
- 4、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周材料投资情况：本周没有设备和材料进场，截止目前所有设备材料价值累计约 336.0 万元。

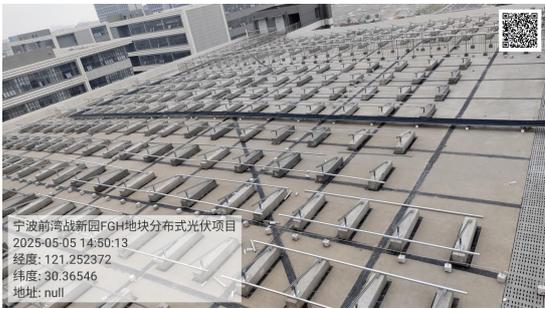
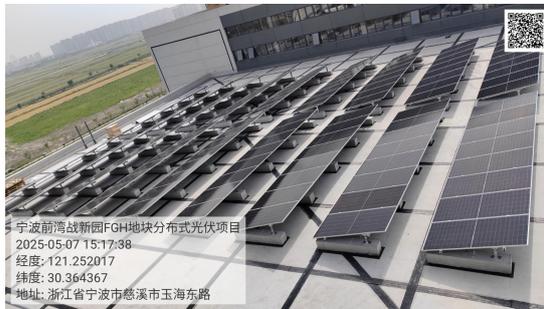
本周已完工程投资情况：施工安装量约 142.1 万元，人工费约 2.5 万元，机械费

约 1.0 万元，合计完成工程量 145.6 万元，占比约 13.5%，截止目前累计完成工程量 247.9 万元，占比约 23.0%。截止目前总投资合计约 336.0（设备材料）+19.8（劳务机械）=355.8 万元，约占总合同价的 33.0%(合同价为 1079.89 万元)。

下步计划：

- 1、F 地块 5#和 6#顶楼材料、组件和逆变器吊装以及安装完成 100%。
- 2、G 地块视情况择机进场施工。
- 3、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
- 4、施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。

附现场照片：

文字描述	H 地块屋顶支架安装情况	H 地块 2#屋顶组件安装雏形
照片	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-05 14:50:13 经度: 121.252372 纬度: 30.36546 地址: null</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-07 15:17:38 经度: 121.252017 纬度: 30.364367 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>
文字描述	H 地块 1#屋顶支架安装情况	H 地块 3#屋顶组件安装情况
照片		

<p>文字描述</p>	<p>H 地块 2#屋顶支架调整情况</p>	<p>H 地块 2#屋顶组件安装情况</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-07 15:39:59 经度: 121.251287 纬度: 30.364035 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-07 15:48:30 经度: 121.251258 纬度: 30.3643 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路</p>
<p>文字描述</p>	<p>H 地块 1#楼顶层吊装 1</p>	<p>H 地块 1#楼顶层吊装 2</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-02 08:03:14 经度: 121.251999 纬度: 30.363823 地址: 浙江省宁波市慈溪市观澜街道</p>	 <p>宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-02 08:16:47 经度: 121.252087 纬度: 30.363946 地址: 浙江省宁波市慈溪市</p>
