

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 05 月 23 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	33.55% 3.7%		
本周下雨天数	1.5 天	实际可施工天数	5.5 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、本周设备和材料进场情况：没有新进材料和设备。 2、H 地块 3#楼顶层/7 层/5 层和 2#楼东侧的原接地系统圆钢恢复和本项目接地系统扁钢焊接完成 100%。 3、F 地块 5#和 6#楼支架材料、组件和逆变器等吊装完成 100%。 4、F 地块 5#和 6#楼支架和组件安装完成 100%。 5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周材料投资情况：本周没有设备和材料进场，截止目前所有设备材料价值累计约 336.0 万元。 本周已完工程投资情况：施工安装量约 35.5 万元，人工费约 3.5 万元，机械费约 0.6 万元，措施项目费约 0.2 万元，合计完成工程量 39.8 万元，占比约 3.7%，截止目前累计完成工程量约 289.8 万元，占比约 26.8%。截止目前总投资合计约 336.0（设备材料）+26.3（劳务		

	机械)=362.3 万元, 约占总合同价的 33.55%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	下周计划: 1、F 地块两栋楼接地系统扁钢焊接完成 100%。 2、H 地块 2#楼屋顶接地系统扁钢焊接完成 100%, 该地块光伏区接地全部完成。 3、H 地块四栋楼屋顶光伏直流线缆桥架安装完成 100%, 视情况进行直流线缆敷设完成约 30%。 4、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。 5、施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。
周工作小结	本周主要以 H 地块两栋楼的原接地恢复和新接地系统制作安装作业为主; F 地块剩余的两栋楼屋顶条形基础摆放、支架和组件安装完成为主。安全措施已落实, 严格执行用电作业安全规范, 特种作业人员均持证上岗佩戴安全帽等防护装备。进度管控, H 地块的 3 栋楼接地和 F 地块的支架组件安装作业按计划有序进行。
需要协调问题	战 G 地块进场事宜, 需继续沟通确认。

目前进度:

- 1、本周设备和材料进场情况: 没有新进材料和设备。
- 2、H 地块 3#楼顶层/7 层/5 层和 2#楼东侧的原接地系统圆钢恢复和本项目接地系统扁钢焊接完成 100%。
- 3、F 地块 5#和 6#楼支架材料、组件和逆变器等吊装完成 100%。
- 4、F 地块 5#和 6#楼支架和组件安装完成 100%。

5、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周材料投资情况：本周没有设备和材料进场，截止目前所有设备材料价值累计约 336.0 万元。

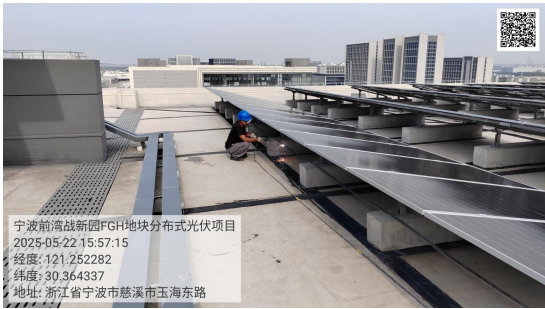
本周已完工程投资情况：施工安装量约 35.5 万元，人工费约 3.5 万元，机械费约 0.6 万元，措施项目费约 0.2 万元，合计完成工程量 39.8 万元，占比约 3.7%，截止目前累计完成工程量约 289.8 万元，占比约 26.8%。截止目前总投资合计约 336.0（设备材料）+26.3（劳务机械）=362.3 万元，约占总合同价的 33.55%（合同价为 1079.89 万元）。

下步计划：

- 1、F 地块两栋楼接地系统扁钢焊接完成 100%。
- 2、H 地块 2#楼屋顶接地系统扁钢焊接完成 100%，该地块光伏区接地全部完成。
- 3、H 地块四栋楼屋顶光伏直流线缆桥架安装完成 100%，视情况进行直流线缆敷设完成约 30%。
- 4、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
- 5、施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。

附现场照片：

文字描述	H 地块 3#楼顶层原接地圆钢恢复	H 地块 3#楼顶层接地扁钢焊接
------	-------------------	------------------

照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-17 10:21:30 经度: 121.252189 纬度: 30.365626 地址: 浙江省宁波市慈溪市	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-17 10:05:36 经度: 121.252207 纬度: 30.365602 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	H 地块 2#楼屋顶接地扁钢焊接情况	H 地块屋顶接地扁钢折弯加工情况
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-22 15:57:15 经度: 121.252282 纬度: 30.364337 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-17 10:11:09 经度: 121.252682 纬度: 30.365725 地址: 浙江省宁波市慈溪市
文字描述	F 地块 5#楼组件搬运待安装	F 地块 5#楼组件安装
照片	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-18 16:05:04 经度: 121.256883 纬度: 30.364349 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路	 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-05-18 16:24:09 经度: 121.256957 纬度: 30.364509 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路
文字描述	F 地块 5#楼材料吊运中	F 地块 6#楼材料吊运中

照片

