

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)		
填报日期	2025 年 05 月 30 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	65.5% 10.6%		
本周下雨天数	0 天	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、本周设备和材料进场情况：三个地块价值约 300.0 万元的交直流线缆到货；F 和 H 地块价值约 40.0 万元的并网柜、汇流箱及始端箱等设备到货。 2、 F 地块 1#楼顶层/7 层/5 层的原接地系统圆钢恢复和本项目接地系统扁钢焊接完成 100%。 3、H 地块 1#、2#和 3#楼屋顶桥架安装及直流线敷设完成 100%。 4、H 地块 1#楼交流线缆敷设完成 100%。 5、F 和 H 地块七栋楼屋顶逆变器安全完成 100%。 6、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。		
投资情况	本周材料投资情况：本周三个地块价值约 300.0 万元的交直流线缆到货；F 和 H 地块价值约 40.0 万元的并网柜、汇流箱及始端箱等设备到货，截止目前所有设备材料价值累计约 676.0 万元。		

	本周已完工程投资情况: 施工安装量约 111.1 万元, 人工费约 3.5 万元, 措施项目费约 0.2 万元, 合计完成工程量 114.8 万元, 占比约 10.6%, 截止目前累计完成工程量约 404.6 万元, 占比约 37.5%。截止目前总投资合计约 676.0(设备材料)+30.0(劳务机械)=706.0 万元, 约占总合同价的 65.5%(合同价为 1079.89 万元)。
下步计划	下周计划: 1、F 地块两栋楼接地系统扁钢焊接完成 100%。 2、F 地块四栋楼屋顶桥架安装及直流线完成 100%。 3、H 地块剩余两楼至配电房交流线缆敷设完成 100%。 4、F 和 H 地块七栋楼屋顶汇流箱安装完成 100%。 5、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。 6、施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。
周工作小结	本周主要以 F 和 H 地块七栋楼的屋顶桥架安装和直流线敷设及新接地系统制作安装作业为主。安全措施已落实, 严格执行用电作业安全规范, 特种作业人员均持证上岗佩戴安全帽等防护装备。进度管控, 桥架安装和线缆敷设作业按计划有序进行。
需要协调问题	战 G 地块进场事宜, 需继续沟通确认。

目前进度:

1、本周设备和材料进场情况: 三个地块价值约 300.0 万元的交直流线缆到货; F 和 H 地块价值约 40.0 万元的并网柜、汇流箱及始端箱等设备到货。

2、F 地块 1#楼顶层/7 层/5 层的原接地系统圆钢恢复和本项目接地系统扁钢焊

接完成 100%。

3、H 地块 1#、2#和 3#楼屋顶桥架安装及直流线敷设完成 100%。

4、H 地块 1#楼交流线缆敷设完成 100%。

5、F 和 H 地块七栋楼屋顶逆变器安全完成 100%。

6、继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周材料投资情况：本周三个地块价值约 300.0 万元的交直流线缆到货；F 和 H 地块价值约 40.0 万元的并网柜、汇流箱及始端箱等设备到货，截止目前所有设备材料价值累计约 676.0 万元。

本周已完工程投资情况：施工安装量约 111.1 万元，人工费约 3.5 万元，措施项目费约 0.2 万元，合计完成工程量 114.8 万元，占比约 10.6%，截止目前累计完成工程量约 404.6 万元，占比约 37.5%。截止目前总投资合计约 676.0（设备材料）+30.0（劳务机械）=706.0 万元，约占总合同价的 65.5%(合同价为 1079.89 万元)。

下步计划：

1、F 地块两栋楼接地系统扁钢焊接完成 100%。

2、F 地块四栋楼屋顶桥架安装及直流线完成 100%。

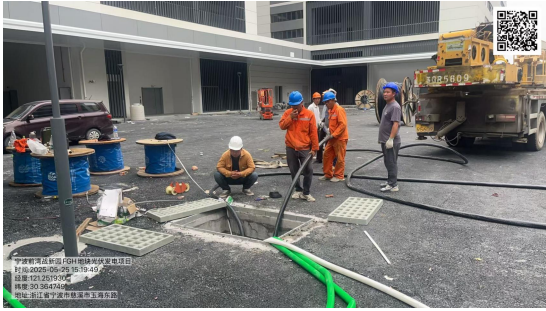
3、H 地块剩余两楼至配电房交流线缆敷设完成 100%。

4、F 和 H 地块七栋楼屋顶汇流箱安装完成 100%。

5、继续进行其他材料和设备的相关采购工作。施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。施工人员进入施工现场确认落实好安全文明施工措施。

附现场照片：

文字	H 地块 1#楼交流线缆敷设	H 地块 1#楼顶层桥架安装和直流线敷设
----	----------------	----------------------

描述		
照片	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-29 15:39:40 经纬度: 121.257799 海拔: 30.365434 地址: 浙江省宁波市海曙区五马南路	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-29 16:33:21 经纬度: 121.257722 海拔: 30.365422 地址: 浙江省宁波市海曙区
文字描述	H 地块 2#楼直流线敷设情况	H 地块屋顶直流线敷设至逆变器端
照片	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-29 15:25:10 经纬度: 121.257799 海拔: 30.365434 地址: 浙江省宁波市海曙区五马南路	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-27 09:11:38 经纬度: 121.257722 海拔: 30.365434 地址: 浙江省宁波市海曙区
文字描述	F 地块 2#楼屋顶桥架安装之一	F 地块 2#楼桥架安装之二
照片	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-28 15:19:57 经纬度: 121.257686 海拔: 30.365774 地址: 浙江省宁波市海曙区	 宁波市海曙区 FGH 地块光伏发电项目 时间: 2025-05-29 16:01:45 经纬度: 121.256605 海拔: 30.365434 地址: 浙江省宁波市海曙区
文字描述	F 地块 1#楼桥架安装之一	F 地块 1#楼桥架安装之二

照片

