



编号: JL- (NBCH) -01

监 理 月 报

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司

3. 2MW 分布式屋面光伏发电项目

2016 年 12 月第 01 期

项目监理部 (章):

专业监理工程师: 张昌辉



报告日期: 2016 年 12 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2016 年 12 月 1 日 结束日期 2016 年 12 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	分部工程名称	分部工程编号	备注
1	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 光伏发电项目	光伏区	1	光伏区	1	

监理单位工作完成情况

专业	事项	工作完成情况	工作计划
影像	1. 光伏区	1. 开关站施工情况: 1 桩基施工完成, 2 号厂房基础施工即将完成。	1. 开关站基础施工情况: 1. 开关站基础施工完成。
影像	2. 光伏区	2. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	2. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	3. 光伏区	3. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	3. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	4. 光伏区	4. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	4. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	5. 光伏区	5. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	5. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	6. 光伏区	6. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	6. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	7. 光伏区	7. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	7. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	8. 光伏区	8. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	8. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	9. 光伏区	9. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	9. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。
影像	10. 光伏区	10. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。	10. 光伏区施工情况: 1. 光伏区施工完成。



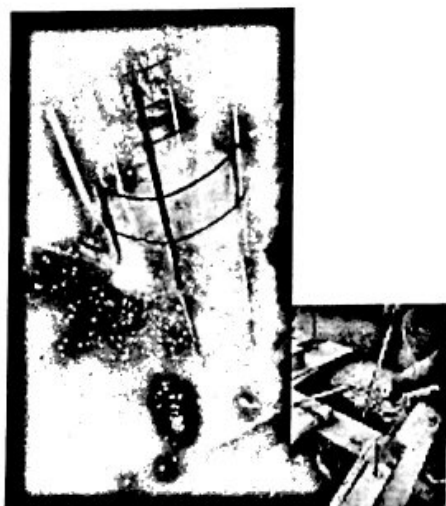

	设备交付进度		
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审		图纸会审完成
	设计交底		设计交底完成
	方案审查	未交付	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	桩基新进场员 工已进行安全 培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	桩基工程施工	桩基工程施 工；主体结构施 工准备；夹具继 续安装；
	主要原材料质量	水泥，钢材有合	对主要材料进



		格证:	行检查
	构(配)件质量	----	----
	设备质量	----	----
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度,加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
无锡中设								
1	定位放线		2016.12.15	2016.12.16	2016.12.17	3.2MW	0MW	
2	基础浇筑		2017.1.15	2016.12.16	2017.1.10			
3	支架安装		2017.2.10	2016.12.16				
4	组件安装		2017.1.10	-----				
5	电缆桥架(直流)							
6	直流电缆4mm ²							
7	直流电缆2*70mm ²							
8	高压电缆							



	3*50/3*7 0 敷设							
9	高压电缆 3*50/3*7 0 安装							
10	变压器安 装							
11	逆变器安 装							
12	SVG 补偿 装置安装							
13	10KV 开关 柜							
14	二次室设 备							

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
无锡中设								
1	支架安装	2016.12.15	2017.2.20	2016.12.16	-----	0MW	50%	
2	组件安装	2017.1.18	2017.2.20	-----		0MW	0	
3	电缆桥架 (直流)							
4	直流电缆 4mm2							
5	直流电缆 70mm2		2					
6	高压电缆 3*50/3*7 0 敷设							
7	高压电缆 3*50/3*7 0 安装							
8	逆变器接 线							
9	10KV 出线							

四、 安全文明施工情况



事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		40 人	1	37	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排主体结构和夹具及组件施工进度计划，及时调整人力、物力；合理安排设备到货情况；。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及电力规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。



常州正衡电力工程监理有限公司
长华长盛汽车零配件有限公司
3.2MW 分布式光伏发电项目监理部

2016 年 12 月 30 日

