

致：陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

事由：

施工图中部分内容需要甲方给予确认。

内容


- 1、招投标中配电室图纸与施工图不一致，施工图中增加了休息室、卫生间，是否按施工图增加此内容。
- 2、配电室没有电气图纸，现在土建施工需要确认是否预留 DN100 套管。
- 3、配电室没有电气施工图纸，关于配电室接地如何施工，请尽快回复。
- 4、配电室和卫生间的隔墙建议采用和室外隔墙相同材质材料进行格挡。
- 5、开挖时遇见雨水管，建议将雨水管围绕敷设后与原接口连接。
- 6、1#箱式变压器——2#箱式变压器；3#箱式变压器——4#箱式变压器；1/2 号箱式变压器~配电室；3/4 号箱式变压器~配电室,之间电缆无规格型号，需甲方尽快确认。

以上 6 项事宜需要甲方给以回复及确认。

项目部（章）：

项目经理：

日期：


2017.10.8.

致：陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

事由：
电缆地沟两次下发图纸不相符，需明确图纸。

内容

设计院下发的第一次配电室电缆沟施工白图，和第二次下发的配电室电缆沟施工白图，两次图纸设计内容不相符，现造成配电室施工依据不准确。请甲方给予明确确认，现场施工时，依照那部施工白图为施工依据？

此项事宜需要监理、甲方给以回复及确认。

项目部（章）：

项目经理：

日期：



工作联系单

工程名称: 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SJAZ-OST-lxd02

致: 陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司
中联西北工程设计研究院有限公司

事由:
施工图中汇集站标高的确认。

设计院发放的图纸中,汇集站的标高和方位没有给予明确的尺寸。开工之前,经业主、监理、设计院及我方现场共同勘探、协商,达成一致意见,经过甲方、监理、设计院三方共同认可,确定汇集站 ± 0 和方位具体尺寸。

± 0 标高: 汇集站以东旧办公楼的散水 ± 0 标高为准。

汇集站定位: 定位方向经欧舒特厂方现场指定方位为准。(后附说明图)

现就此事宜请业主、监理、设计院方给予回复确认。

项目部

项目经理

日

期:

2017.10.17

注 本表一式 6 份,由施工项目部填写,业主项目部、监理项目部各存 2 份,施工项目部存 2 份。


工程名称: 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏项目


汇电站.	室内地面 10.3m
------	------------

汇电站标高图.

10.000m
室外散水

办公楼



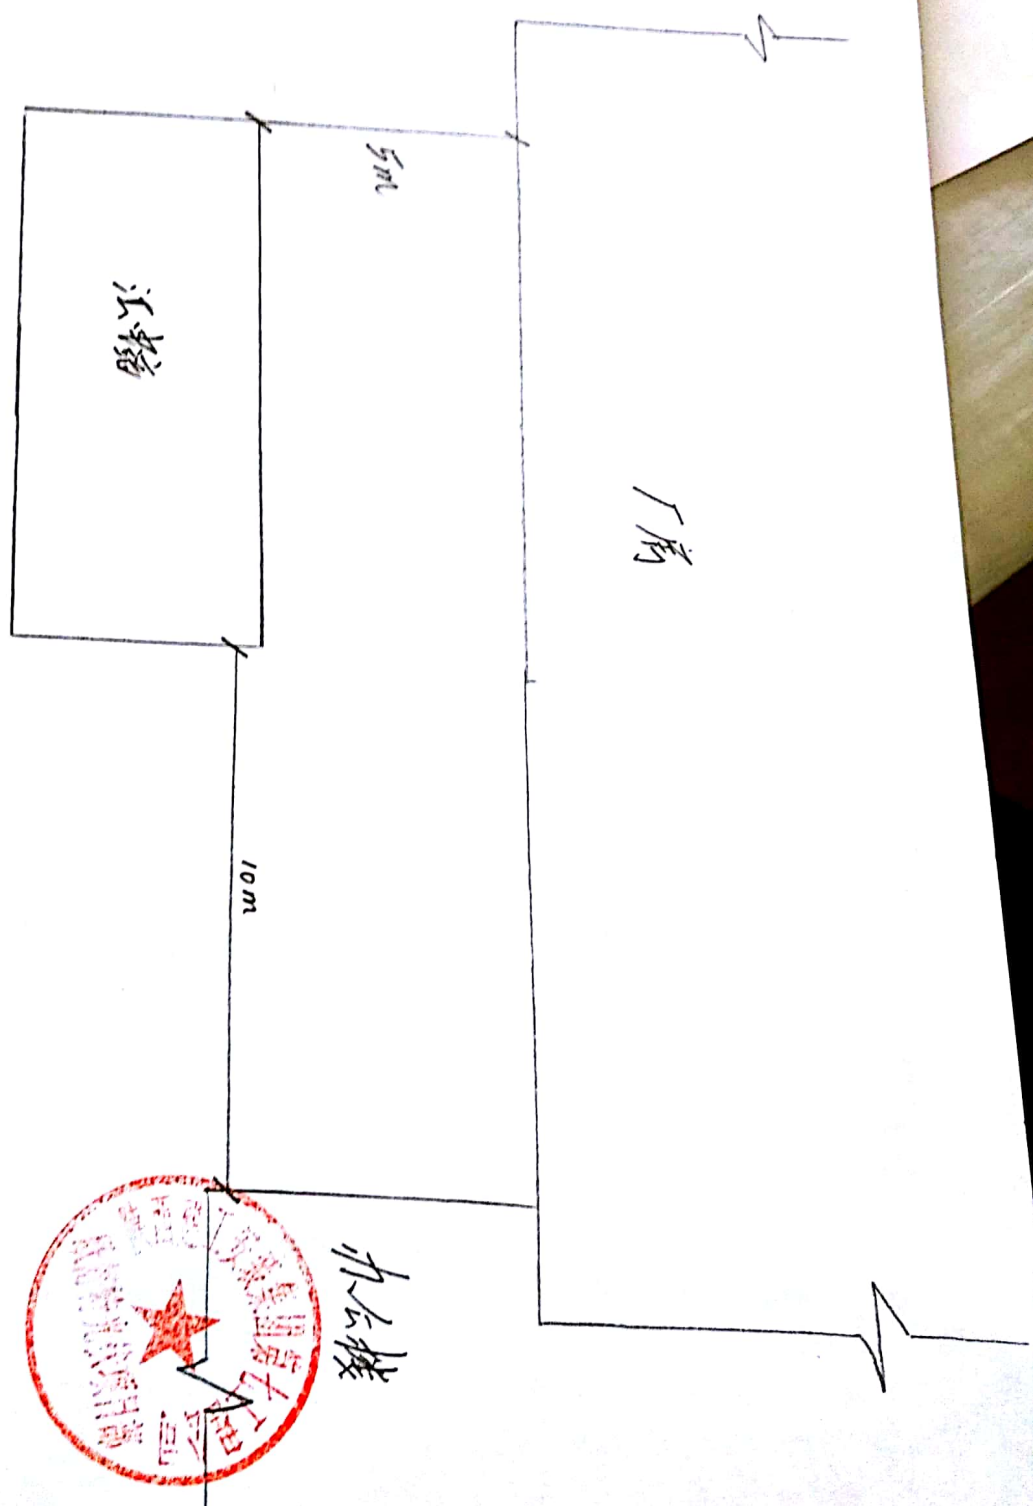

汇箱站定位图

工作联系单

工程名称： 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： SJAZ-OST-lxd03

致： 陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司
中联西北工程设计研究院有限公司

事由： 汇集站钢柱底部砼浇筑事宜

内容： 混凝土基础顶部与钢柱底板之间原设计为 C40 无收缩细石混凝土，现因施工使用方量过少，商混站无法供应。经项目部商议确定进行现场自拌 C40 细石混凝土加微膨胀剂的方式进行浇筑，请设计院进行确认。

就此事宜请甲方、监理方共同协商，给与回复。

项目部（章）

项目经理： 孙振

日期： 2017.10.19

注 本表一式 6 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 2 份，施工项目部存 2 份。
