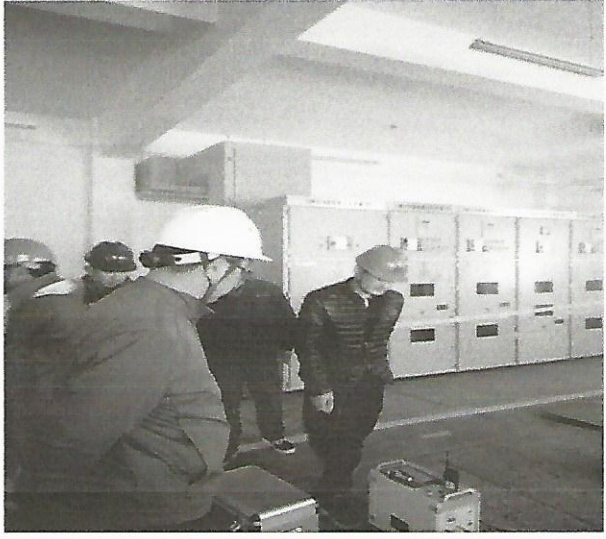


旁站监理记录

工程名称：通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及气候：2017 年 03 月 09 日	工程地点：3、4 号塘
旁站监理的部位或工序：箱变电缆头测试试验	
旁站监理开始时间：08：00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、5 人施工，监护 1 人，电缆制作 2 人，试验 1 人，记录一人。 4、施工仪器：万用表、电容分压器-FRC-100V/1000PF、电抗器-DK-25KA/25KV、励磁变压器 JLB-4.5KVA/3KV/200V/400V、变频串联谐振试验装置-HMCXZ-75KVA/25KV/75KV。 5、现场设备齐全安全施工。	
 	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查设备运转正常。	
发现问题：试验人员未带安全帽	
处理意见：及时提醒佩戴安全帽	
备 注：	
施工项目部：江苏华能建设工程集团有限 质 检 员：陈超 日 期：2017 年 03 月 09 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公 旁站监理人员：田立欣 日 期：2017 年 03 月 09 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。
