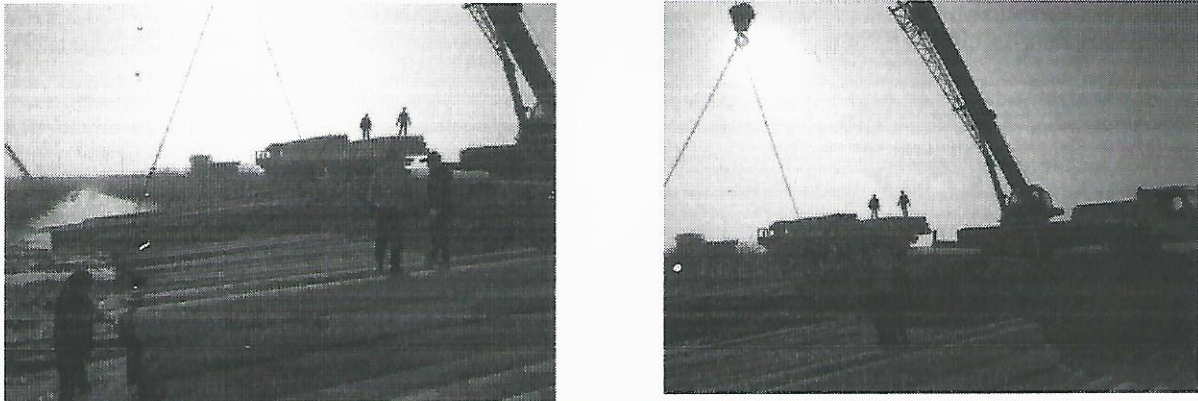


旁站监理记录表

工程名称：通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目编号：ZHJL-PZJL-003

日期及气候：2016 年 11 月 14 日	工程地点：3 号塘
旁站监理的部位或工序：3 号塘管桩原材料卸货	
旁站监理开始时间：08：30	旁站监理结束时间：09：30
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用建华材料 PHC 400A *80*6.5 4、5 人施工，操作员一名，验货员一名，操作工三名。 5、货车两辆，吊车一台。 6、现场卸桩设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号：PHC 400A *80*6.5	
发现问题：卸桩人员未佩戴安全帽	
处理意见：督促卸桩人员佩戴安全帽	
备 注：	
施工项目部：江苏华能建设工程集团有限公司 质 检 员：陈超	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵淑庭
日 期：2016 年 11 月 14 日	日 期：2016 年 11 月 14 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。
