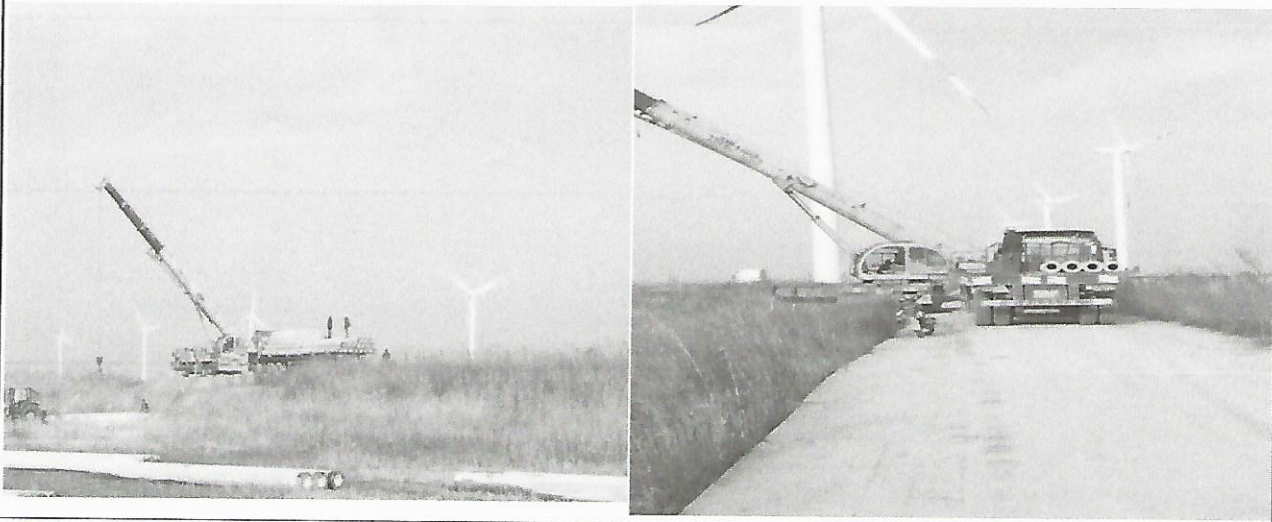


旁站监理记录

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-0019

日期及气候: 2016 年 11 月 25 日	工程地点: 3 号塘
旁站监理的部位或工序: 3 号塘管桩原材料卸货	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 10:00
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用建华材料 PHC 400A *80*6.5 4、5 人施工, 操作员一名, 验货员一名, 操作工三名。 5、货车三辆, 吊车一台。 6、现场卸桩设备配备齐全。	
	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号: PHC 400A *80*6.5	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 江苏华能建设工程集团有限 公司	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: <u>陈光超</u>	旁站监理人员: <u>赵淑庭</u>
日 期: 2016 年 11 月 25 日	日 期: 2016 年 11 月 25 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。
