

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-1

日期及气候： 2017-03-4 2/16℃ 多云	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序： 预制桩的起吊、堆放	
旁站监理开始时间： 12:30	旁站监理结束时间： 15:20
施工情况： 1. 施工人员 4 名； 2. 安全员 1 名； 3. 施工机具： 吊车一台； 4. 预制桩起吊、堆放，起吊过程要轻吊轻放，避免剧烈碰撞；水平运输，应做到桩身平稳放置。	
监理情况： 1. 混凝土预制桩规格型号正常； 2. 起吊过程起吊轻放，避免剧烈碰撞； 3. 叠层堆放符合堆放规范；	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部：上海上电电力工程有限公司  质检员（签字）： <u>戚明尧</u> 日期： 2017 年 3 月 4 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员： <u>王立新</u> 日期： 2017 年 3 月 4 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-2

日期及气候： 2017-03-05 3/17℃ 多云	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序： 预制桩的起吊、堆放	
旁站监理开始时间： 13:30	旁站监理结束时间： 15:00
施工情况： 1. 施工人员 4 名； 2. 安全员 1 名； 3. 施工机具： 吊车一台； 4. 预制桩起吊、堆放，起吊过程要轻吊轻放，避免剧烈碰撞；水平运输，应做到桩身平稳放置。	
监理情况： 1. 混凝土预制桩规格型号正常； 2. 起吊过程起吊轻放，避免剧烈碰撞； 3. 叠层堆放符合堆放规范；	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部：上海上电电力工程有限公司  质检员（签字）：  日期： 2017 年 3 月 5 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员：  日期： 2017 年 3 月 8 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-3

日期及气候： 2017-03-06 3/16℃ 晴	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序： 预制桩打桩	
旁站监理开始时间： 10:00	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 1. 施工人员 6 名； 2. 安全员 1 名； 3. 施工机具： 液压挖掘机一台， 液压打桩机一台；	
监理情况： 1. 预制桩完好， 规格长度符合图纸要求； 2. 预制桩定位无误； 3. 预制桩施工在允许偏差范围类。 4. 桩身无裂缝。	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部： 上海上电电力工程有限公司 质检员（签字）：  戚明磊 日期： 2017 年 3 月 4 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  王立新 日期： 2017 年 3 月 6 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号: QY-QJ-4

日期及气候: 2017-03-08 4/17℃ 晴	施工地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 预制桩打桩	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 15:20
施工情况: 1. 施工人员 6 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 液压挖掘机一台, 液压打桩机一台;	
监理情况: 1. 预制桩完好, 规格长度符合图纸要求; 2. 预制桩定位无误; 3. 预制桩施工在允许偏差范围类。 4. 桩身无裂缝, 共完成打桩 116 根。	
发现问题:	
处理意见:	
项目经理部: 上海上电电力工程有限公司 质检员 (签字):  日期: 2017 年 3 月 8 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  日期: 2017 年 3 月 8 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-5

日期及气候： 2017-03-25 3/16℃ 晴	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序：光伏组件安装	
旁站监理开始时间： 10:00	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 1. 施工人员 7 名； 2. 安全员 1 名； 3. 组件支架安装，支架平面要达到设计要求，倾斜角为 30 度，允许误差范围±1°，支架连接处螺丝要紧固； 4. 施工人员要戴安全帽、穿反光背心等防护设备	
监理情况： 1. 施工佩戴安全帽，手套，反光背心等防护用具 2. 光伏组件支架平面整齐，倾斜角为 30 度，允许误差范围±1°，符合设计要求； 3. 光伏组件连接处螺丝紧固，未发现松动。 附图：  	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部：上海上电电力工程有限公司  质检员（签字）：戚明勇 日期：2017 年 3 月 25 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员（签字）：王立新 日期：2017 年 3 月 25 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

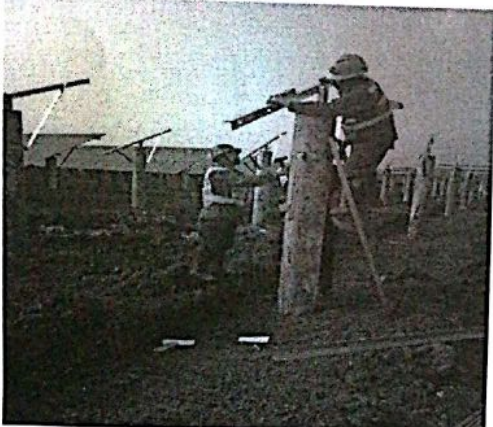
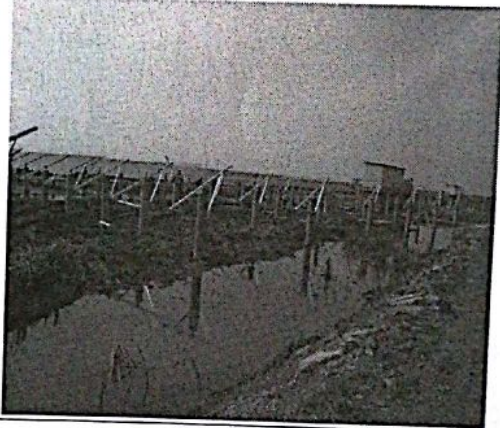



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号: QY-QJ-6

日期及气候: 2017-03-27 5/17℃ 晴	施工地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1. 施工人员 7 名; 2. 安全员 1 名; 3. 组件支架安装, 支架平面要达到设计要求, 倾斜角为 30 度, 允许误差范围 $\pm 1^\circ$, 支架连接处螺丝要紧固; 4. 施工人员要戴安全帽、穿反光背心等防护设备	
监理情况: 1. 施工佩戴安全帽, 手套, 反光背心等防护用具 2. 光伏组件支架平面整齐, 倾斜角为 30 度, 允许误差范围 $\pm 1^\circ$, 符合设计要求; 3. 光伏组件连接处螺丝紧固, 未发现松动。 附图:  	
发现问题:	
处理意见:	
项目经理部: 上海上电电力工程有限公司 质检员 (签字):  日期: 2017 年 3 月 27 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  日期: 2017 年 3 月 27 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称: 金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号: QY-QJ-7

日期及气候: 2017-03-26 5/17℃ 晴	施工地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:30

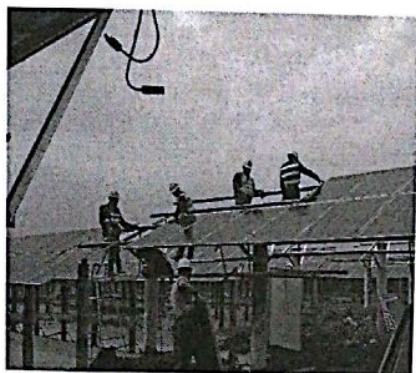
施工情况:

1. 施工人员 7 名;
2. 安全员 1 名;
3. 光伏组件安装, 组件平面要达到设计要求, 倾斜角为 30 度, 允许误差范围 $\pm 1^\circ$, 组件与支架连接处螺丝要紧固;
4. 施工人员要戴安全帽、穿反光背心等防护设备

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 反光背心等防护用具
2. 光伏组件平面整齐, 倾斜角为 30 度, 允许误差范围 $\pm 1^\circ$, 符合设计要求;
3. 光伏组件与支架连接处螺丝紧固, 未发现松动。

附图:



发现问题:

处理意见:

项目经理部: 上海上电电力工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字):

旁站监理人员 (签字):

日期: 2017 年 3 月 26 日

日期: 2017 年 3 月 26 日

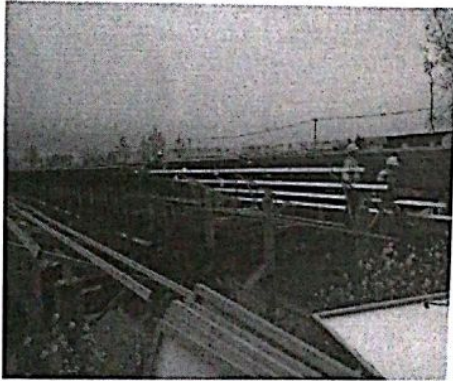
填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-8

日期及气候： 2017-03-31 6/16℃ 晴	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序：光伏组件安装	
旁站监理开始时间： 14:00	旁站监理结束时间： 15:30
施工情况： 1. 施工人员 7 名； 2. 安全员 1 名； 3. 光伏组件安装，组件平面要达到设计要求，倾斜角为 30 度，允许误差范围$\pm 1^\circ$，组件与支架连接处螺丝要紧固； 4. 施工人员要戴安全帽、穿反光背心等防护设备	
监理情况： 1. 施工佩戴安全帽，手套，反光背心等防护用具 2. 光伏组件平面整齐，倾斜角为 30 度，允许误差范围$\pm 1^\circ$，符合设计要求； 3. 光伏组件与支架连接处螺丝紧固，未发现松动。 附图：  	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部：上海上电电力工程有限公司  质检员（签字）：戚明勇 日期：2017年3月31日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员（签字）：王亚新 日期：2017年3月31日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

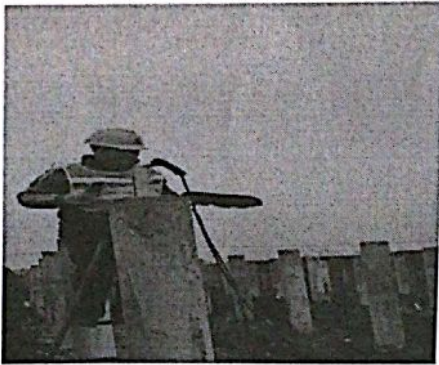


由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：QY-QJ-4

日期及气候： 2017-03-23 3/16℃ 晴	施工地点： 光伏区
旁站监理的部位或工序： 立柱焊接	
旁站监理开始时间： 10:00	旁站监理结束时间： 11:30
施工情况： 1. 施工人员 2 名； 2. 安全员 1 名； 3. 施工机具：焊机两台； 4. 焊接要求未住连接焊缝均为满焊，施焊时焊工应戴安全帽，保护镜，手套； 5. 焊接完成后应清除点焊渣。	
监理情况： 1. 焊工佩戴安全帽，保护镜手套等防护用具 2. 立柱焊接焊缝饱满； 3. 焊工有相应的操作证，机械运行正常。 附图：  	
发现问题：	
处理意见：	
项目经理部：上海上电电力工程有限公司  质检员（签字）：金明强 日期：2017 年 3 月 23 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员（签字）：王亚新 日期：2017 年 3 月 23 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

