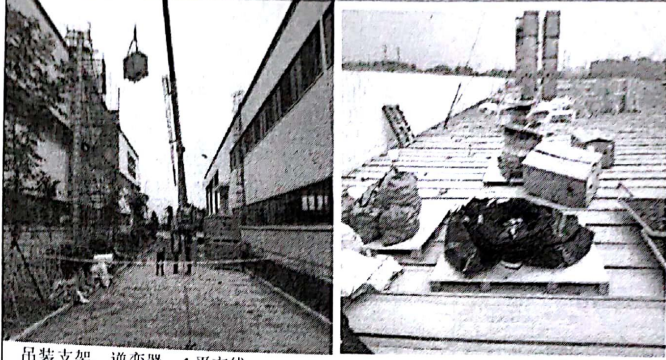


安全旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		现场吊装组件、4平方线、逆变器	
作业地点			
作业项目		吊装支架、逆变器、4平方线	
主要危险分析		在吊装过程中会有人员通过	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	12名施工人员及1名吊装司机； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	屋顶为了防止集中承力采用分散吊装组件、四平方线、逆变器；25t吊装一台； 周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	周围设置安全警示带。	
现场主要问题	现场厂区人员走动或者施工人员在吊车作业时站在吊装材料下方。		监理有关措施 现场口头通知并整改 复验意见： 整改完毕，符合要求
	整改结果： 施工时间段内周边无人员走动，施工人员在机械吊装时远离材料。		
旁站时间	开始	2018年7月2日13时	对应作业
	结束	2018年7月2日15时	

旁站监理人员（签名）：张俊东

作业负责人（签名）：李辉

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
