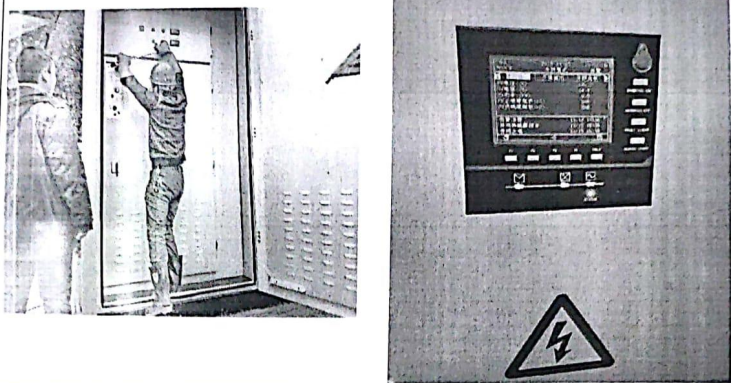


安全旁站监理记录表

工程名称: 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容	车队区并网合闸		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	施工人员必须带好绝缘手套,, 确定各相序是否接好, 并做好安全措施		
施工组织	6 名施工人员;		
现场安全管理	施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
安全文明	周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。		
施工评价	安全措施		
现场主要问题	小雨, 雨停后方可合闸	监理有关措施	复验意见:
	整改结果: 待雨停后, 进行合闸		已按要求进行合闸
旁站时间	始	2018 年 11 月 15 日 14 时	对应
	结束	2018 年 11 月 15 日 16 时	作业

旁站人员 (签名): 任志美 张良杰

作业负责人 (签名): 李俊芳

注 1 记录由旁站监理人员填写。

2 “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 不漏项。
