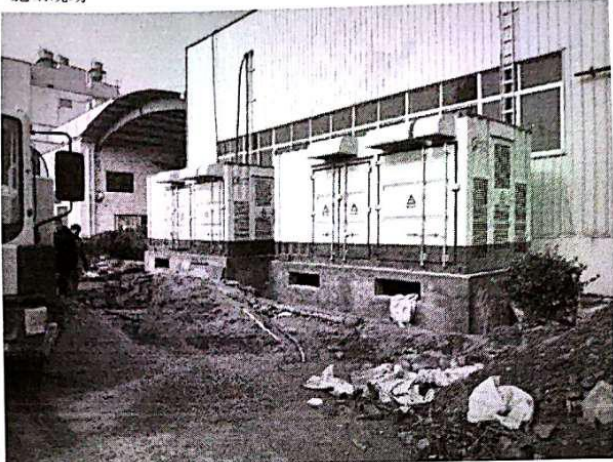


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSPZ-004

现场工作内容		箱逆变吊装	
作业地点		施工现场 	
作业项目 主要危险分析		在吊装过程中会有人员通过	
施工现场安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名吊装司机； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	50t 吊装机一台，安全员 1 名周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	周围设置安全警示带。	
现场 主要 问题	闲杂人等在吊车周围走动。		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 安全员对吊装区域无关人员驱离。		
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 16 日 10 时	对应 作业
	结束	2018 年 12 月 16 日 14 时	

旁站监理人员（签名）：杨铃铃

作业负责人（签名）：叶东雨
