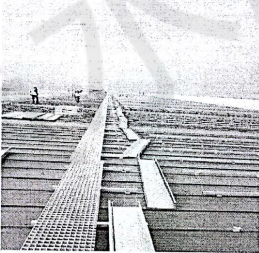


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-FLJAQPZ-03

日期及气候：2018年11月18日 晴		工程地点：江苏福莱居有限公司	
旁站监理的部位及工序：光伏区逆变器吊装			
旁站监理开始时间：14:00		旁站监理结束时间：16:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 6 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，施工人员 4 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：25T 吊车一台。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑逆变器→吊装逆变器→分散逆变器。 			
监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）：		2018 年 11 月 18 日	
