


监理安全检查记录表

工程名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号: XAZT-AQJC-005

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 14 日	检查地点	装配式结构厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	装配式结构厂房屋面逆变器支架焊接时, 四周堆放着很多碎纸箱、编织袋, 极易引起失火, 存在着较大的安全隐患。		
存在问题			
整改要求	装配式结构厂房屋面逆变器支架焊接时, 四周堆放着很多碎纸箱、编织袋, 极易引起失火, 存在着较大的安全隐患; 要求施工人员立即停止电焊作业, 清理现场易燃物品, 配备灭火器材, 待监理检查合格后方可焊接作业。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2019.01.14
整改情况	已经按照监理项目部要求整改。 整改负责人: 韩俊岗 日期: 2019.01.26.		
复查意见	没有配备灭火器材, 整改不到位。 复查人: 高飞 日期: 2019.01.28.		

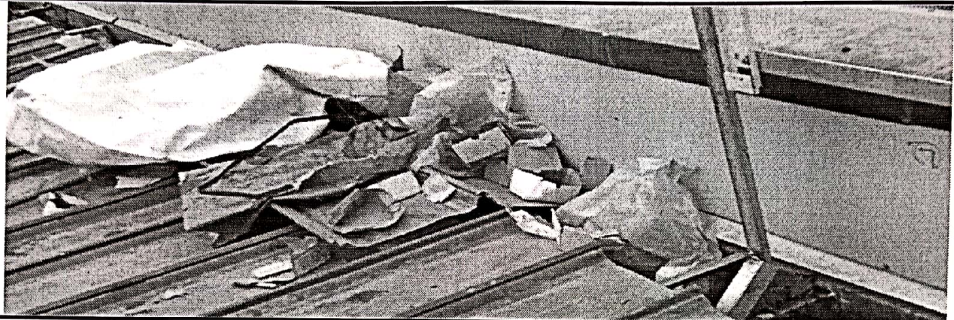
