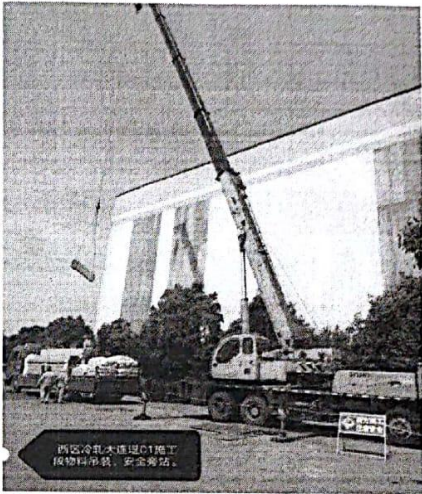


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-013

现场工作内容	冷轧厂屋面吊装作业		
作业地点	 		
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	16 名施工人员及 1 名吊装车司机；管理人员 3 人；指挥人员上下各 1 人； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	水泥地面平整。	
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，屋面信号员指挥并穿好反光背心与系好安全带。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	路面可能经过车辆；物料较多禁止集中堆放，应分散放各施工点；吊装时使用钢丝绳吊装时绳易脱落易发生安全事故；	监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面经过车辆；要求施工方将吊装的材料在屋面散开；要求施工方将钢丝绳换为吊带；吊装完毕要求施工方尽快清理现场。		复验意见：
旁站 时间	开始	2019 年 06 月 04 日 8 时	对 应 作 业
	结束	2019 年 06 月 02 日 12 时	

旁站监理人员（签名）：秦楠章

作业负责人（签名）：周联 2019.6.2

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
