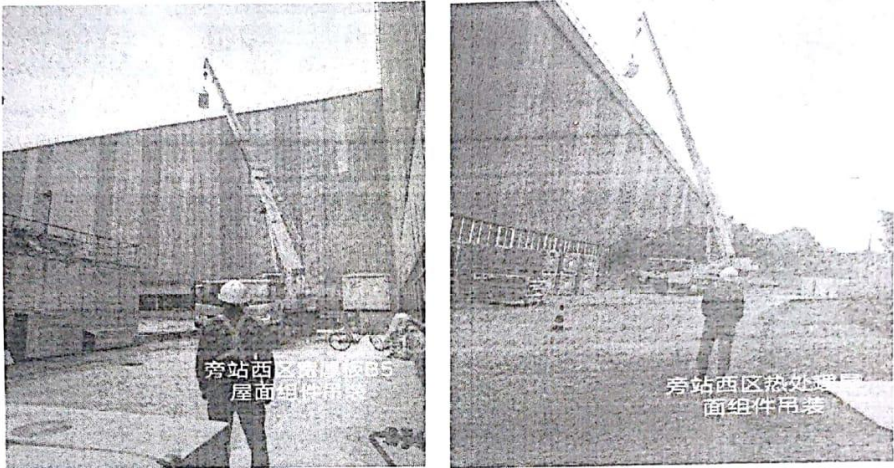


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-AQPZ-038

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目				
现场工作内容		西区 (B2、B5) 吊装		
作业地点				
作业项目 主要危险分析		信号员; 警示带; 安全帽; 施工路面; 屋面堆放;		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	80 名施工人员及 1 名吊装车司机; 管理人员 7 人; 指挥人员 2 人 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。		
	平面 布置	屋面平整; 吊装时水泥地面平整;		
	安全 措施	设置警示带, 工人佩戴安全帽, 屋面信号员指挥并穿好反光背心与系好安全带。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换, 起吊作业时, 要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求, 严禁吊车超载作业;		
现场主要问题		吊装时使用钢丝绳吊装时绳易脱落易发生安全事故; 吊装至屋面后堆积造成安全隐患。 整改结果: 要求施工方将钢丝绳换为吊带; 吊装完毕要求施工方尽快清理现场; 吊装至屋面及时分散不得堆积		监理 有关 措施 复验意见:
旁站 时间		开始	2019 年 7 月 6 日 9 时	对应 作业
		结束	2019 年 7 月 6 日 16 时	

旁站监理人员(签名): 曹航 2017.07.06

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

作业负责人(签名): 高玉有 2019.07.20

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
