
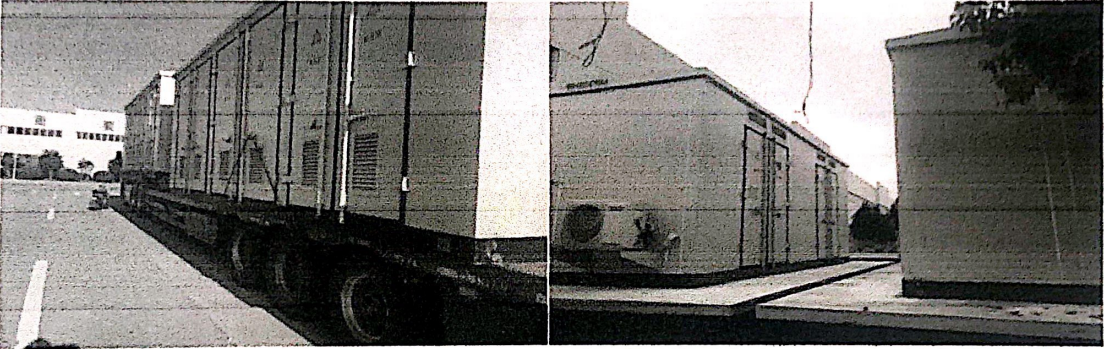


安全旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-AQPZ-07

日期及气候：2019年08月30日 晴		工程地点：河南省浙商纺织有限公司	
旁站监理的部位及工序：一次舱设备到货及吊装			
旁站监理开始时间：7:10		旁站监理结束时间：17:20	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名，项目部其他管理人员均在岗旁站指导。 2. 设备于早上到达现场，因现场通道受限，对现场钢结构制作区域拆除后，满足挂车正常倒车及前进。 3. 下午吊车进场，采用 75t 吊车 4. 作业人员共计 8 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机及指挥 4 人，记录人员 1 人。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→吊车支起→设备底部焊接切除→吊杠、钢丝绳固定至设备底部吊装点→吊装至设备基础平台			
			
监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。 5. 吊装按照吊装方案执行，前一天已对吊装区域进行实勘，确定吊装事宜			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）：   2019年8月30日			

