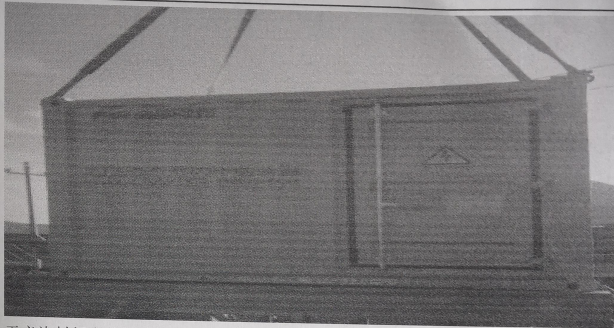


安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-026

现场工作内容	 天义沟村级光伏扶贫电站吊装高压动态无功补偿装置		
作业地点	天义沟村级电站		
作业项目	信号员、警示带、安全帽、雪后施工路滑。		
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名 25 吨吊车司机；管理人员 1 名；指挥人员 1 名； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	樱桃沟门村村级光伏扶贫电站 SVG 基础四周	
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	施工人员没有佩戴安全帽、防滑鞋。	监理 有关 措施	要求现场施工负责人立即给工人配备安全帽、防滑鞋。
	整改结果：现场负责人已经给工人配备相应的安全帽、防滑鞋、棉手套。		复验意见：已经整改
旁站 时间	开始	2019 年 12 月 14 日 13 时	对应
	结束	2019 年 12 月 14 日 14 时	作业
			工程机械开始吊运
			工程机械吊运完成

旁站监理人员（签名）：

张建平

作业负责人（签名）：

田立成

注 1、记录由旁站监理人员填写；

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
