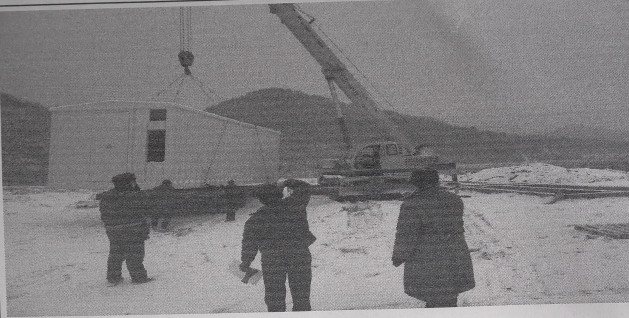


安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-028

现场工作内容	 三岔口村级光伏扶贫电站吊装电气二次舱设备			
作业地点	三岔口村级电站			
作业项目 主要危险分析	信号员、警示带、安全帽、雪后施工路滑。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5名施工人员及1名25吨吊车司机；管理人员1名；指挥人员1名； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。		
	平面 布置	三岔口村级光伏扶贫电站吊装电气二次舱设备基础四周		
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	施工人员没有佩戴安全帽、防滑鞋。		监 理 有 关 措 施	要求现场施工负责人立即给工人配备安全帽、防滑鞋。
	整改结果：现场负责人已经给工人配备相应的安全帽、防滑鞋、棉手套。			复验意见：已经整改
旁站 时间	开始	2019年12月16日10时	对 应 作 业	工程机械开始吊卸
	结束	2019年12月16日12时		工程机械吊卸结束

旁站监理人员（签名）： 刘银刚

作业负责人（签名）： 郭素

注 1. 记录由旁站监理人员填写；

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
