

安全旁站监理记录表


工程名称: 荆门万华家居(二期)屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMW-H-ZHJL-AQPZ-07

日期及气候: 2019年10月17日 多云		工程地点: 荆门市东宝区子陵镇万华大道1号	
旁站监理的部位及工序: 4#仓库组件吊装			
旁站监理开始时间: 7:10		旁站监理结束时间: 11:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计单位 12 人, 其中工作负责人(安全员) 1 人, 吊车司机 1 人, 记录人员 1 人。 4. 施工器具: 25T 车一台。 5. 作业顺序: 吊车周边拉警戒线→吊车至屋顶、一随吊随散开。			
 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 4#仓库组件吊装 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 蔡柏林 拍摄时间: 2019.10.17 09:22 天气: 多云 12°C 地点: 荆门市·万华湾 今日水印 - 相机 -			
 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 4#仓库组件吊装 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 蔡柏林 拍摄时间: 2019.10.17 09:10 天气: 多云 12°C 地点: 荆门市·万华湾 今日水印 - 相机 -			



扫描全能王 创建

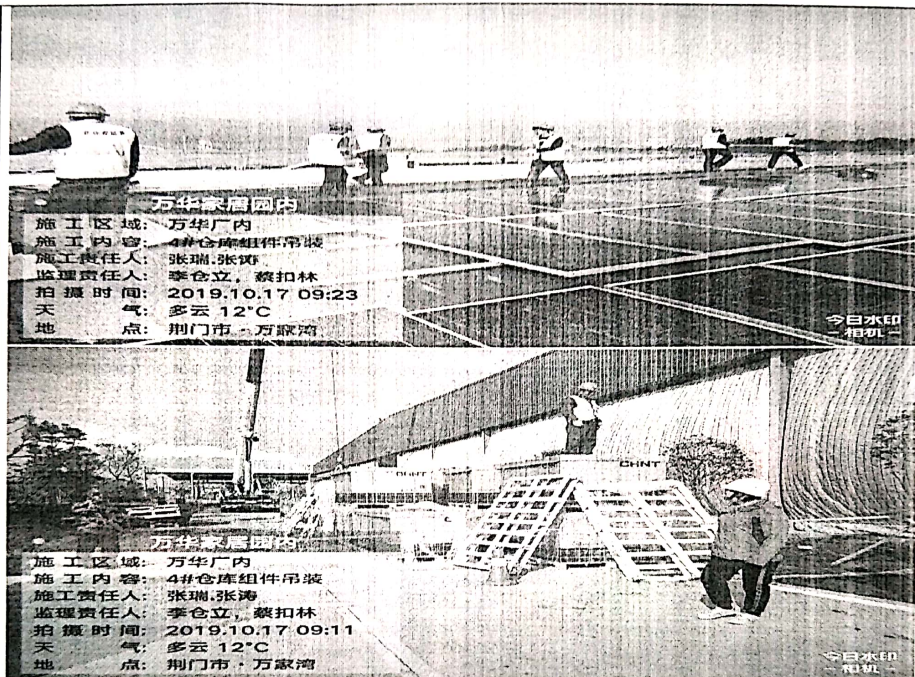


监理情况:

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中, 吊车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员 (签字):

李仓立 蔡扣林



扫描全能王 创建
