

安全旁站监理记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHJL-AQPZ-09

日期及气候: 2019年10月21日 多云 | 工程地点: 荆门东宝区子陵镇万华大道1号


旁站监理的部位及工序: 1#仓库组件吊装

旁站监理开始时间: 7:10

旁站监理结束时间: 18:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场负责人1名, 技术人员2名, 安全员1名。
2. 交底记录清楚, 安全设施及工器具齐全。
3. 作业人员共计14人, 其中工作负责人1人, 吊车司机1人, 记录人员1人。
4. 施工器具: 25T 车一台。
5. 作业顺序: 吊车周边拉警戒线 → 1#仓库吊装组件、→ 直接散开。

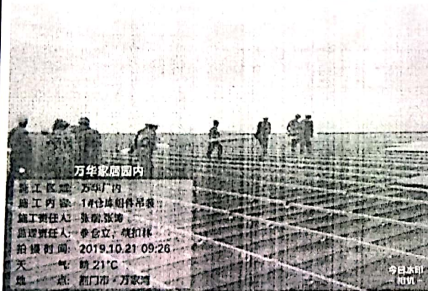

监理情况:

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中, 叉车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

李金全 蔡和林



扫描全能王 创建
