

安全旁站监理记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHJL-AQPZ-15

日期及气候: 2019年11月25日 阴

工程地点: 荆门东宝区子陵镇万华大道1号


旁站监理的部位及工序: 一次仓吊装

旁站监理开始时间: 13:20

旁站监理结束时间: 14:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。
2. 交底记录清楚, 安全设施及工器具齐全。
3. 作业人员共计 8 人, 其中工作负责人 1 人, 吊车司机 1 人, 记录人员 1 人。
4. 施工器具: 25T 车一台。
5. 作业顺序: 吊车周边拉警戒线→一次仓吊装→一次仓就位吊装完成。

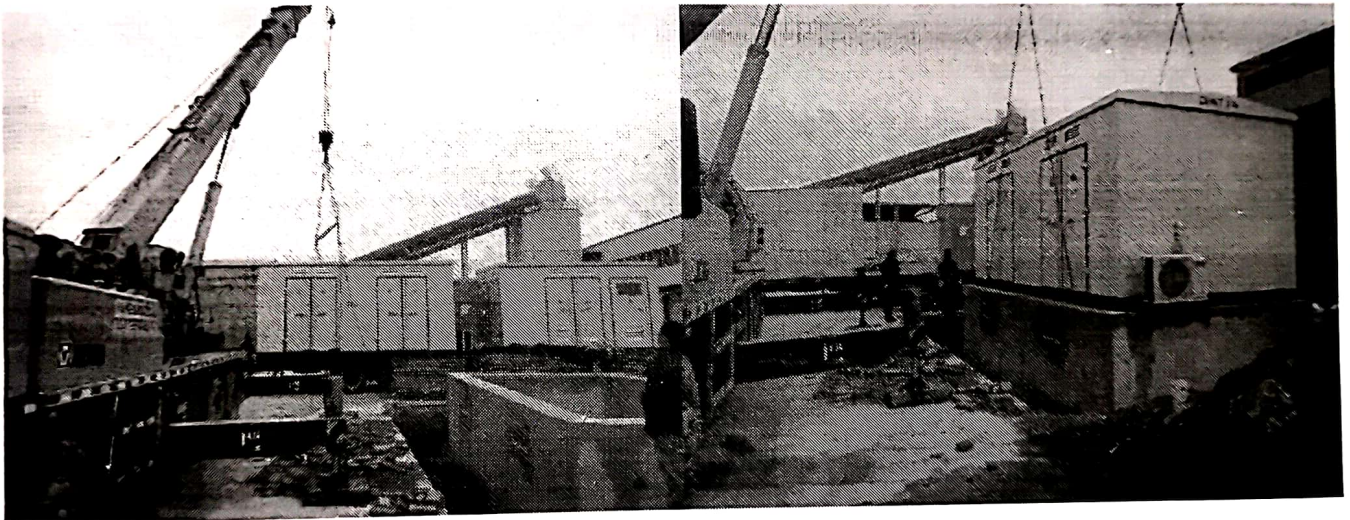

监理情况:

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中, 吊车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

唐恒

2019年11月25日



扫描全能王 创建
