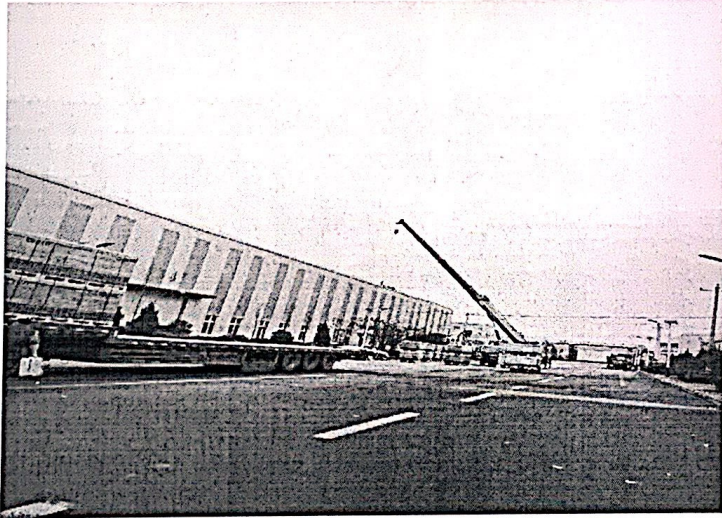


安全旁站监理记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-AQPZ-05

现场工作内容	光伏组件 2#厂房吊装		
作业地点	1. 现场负责人 1 名，安全员 1 名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 7 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，施工人员 4 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：25T 吊车一台。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑组件→吊运组件→吊装至屋面分散。 		
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1 名现场管理，1 名吊车司机，1 名安全员，4 名施工人员； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好。	
现场主要问题	无	监 理 有 关 措 施	无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2019 年 11 月 24 日 08 时	对应 作业
	结束	2019 年 11 月 24 日 12 时	

旁站监理人员（签名）：孙金龙

作业负责人（签名）：张培培

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。
