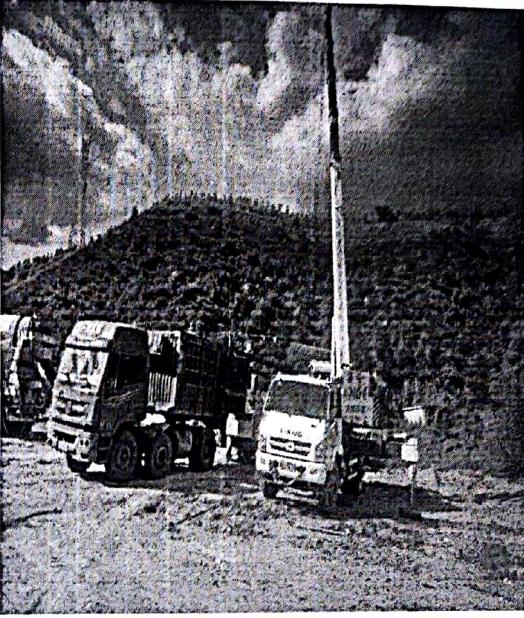


安全旁站监理记录表

工程名称：崇礼区9个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	场上村吊装作业		
作业地点	 		
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	18名施工人员及1名吊装车司机；管理人员3人；指挥人员上下各1人；施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	素土地面安置木墩支撑	
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	吊装时使用钢丝吊装时绳易脱落易发生安全事故；		监理 有关 措施
	整改结果： 要求施工方将钢丝绳换为吊带；吊装完毕要求施工方尽快清理现场。		
旁站 时间	开始	2019年9月20日9时	对应 作业
	结束	2019年9月20日12时	

旁站监理人员（签名）：张良军

作业负责人（签名）：高强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建
