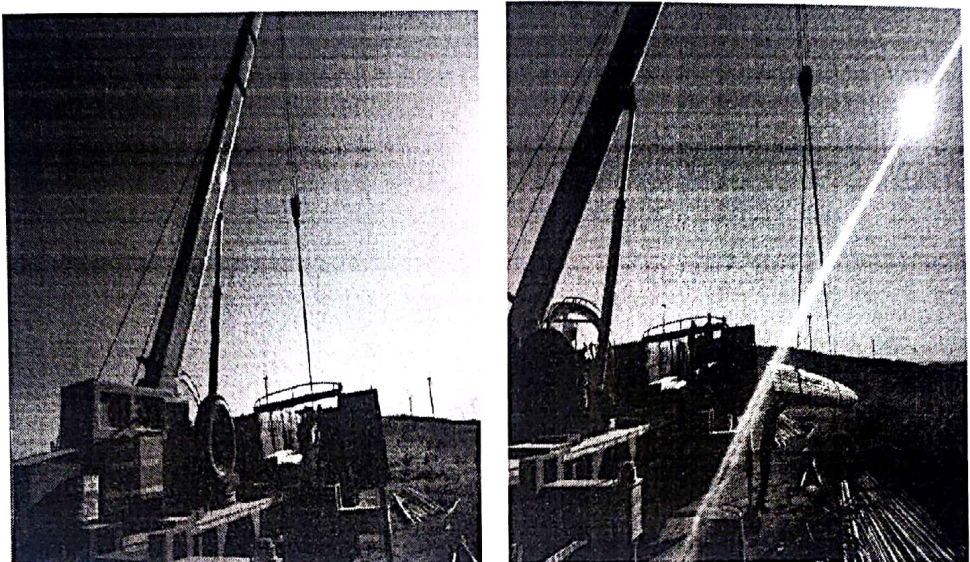


安全旁站监理记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容	红旗营吊装作业		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	20 名施工人员及 1 名吊装车司机；管理人员 3 人；指挥人员上下各 1 人； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面布置	素土地面安置木墩支撑	
	安全措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	个别人员未佩戴安全帽，要求吊装时佩戴安全帽；		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 已佩戴安全帽。		
旁站 时间	开始	2019 年 9 月 22 日 14 时	对应 作业
	结束	2019 年 9 月 22 日 16 时	

旁站监理人员（签名）：张俊

作业负责人（签名）：乔强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建
