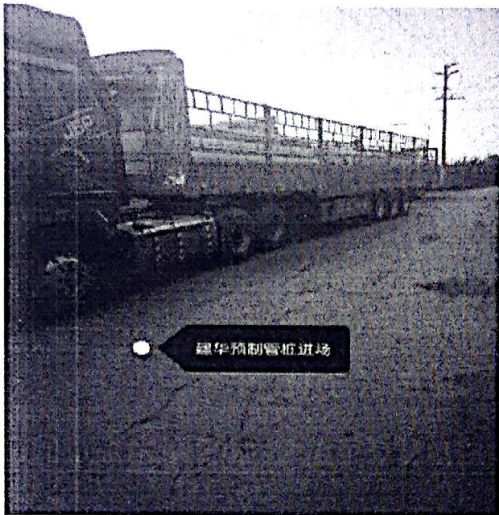
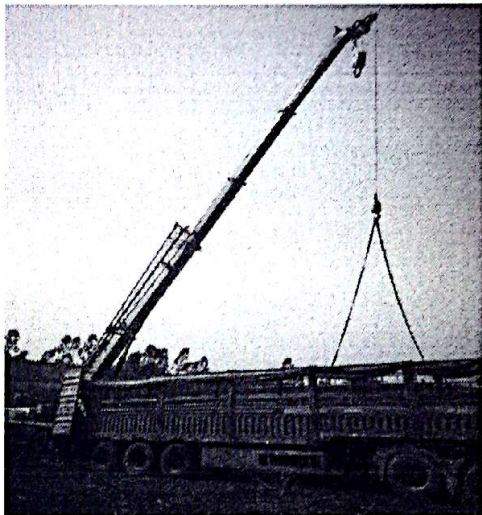


安全旁站监理记录表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-AQPZ-011

现场工作内容	对 4 区进场管桩吊装卸车		
作业地点	 		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	2 名施工人员及 1 名吊装车司机; 施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护	
	平面布置	1、施工区域现场布置满足施工安全要求。 2、地面较平整, 无塌方隐患。	
	安全措施	1、管桩吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要求铁钩紧固在管桩接口处, 防止管桩吊装时脱落高空坠落发生安全事故。 2、现场人员佩戴安全帽, 远离吊装区域。	
现场主要问题	无	监理 有关 措施	要求现场卸桩人员在起吊时远离卸桩点, 桩落地后再进行卸桩。
	整改结果: 无		复验意见: 已落实
旁站时间	开始	2019 年 11 月 7 日 9 时	对应作业
	结束	2019 年 11 月 7 日 11 时	

旁站监理人员 (签名):

王利

作业负责人 (签名):

杨振宇
